

วิธีการใช้งานระบบ CQT


สำหรับ PE/SE , PM , PJM Head

Agenda

- การเข้าระบบ
- วิธีการตรวจงวดงาน สำหรับ PE/SE
- วิธีการอนุมัติงาน โดย PM
- ทำอย่างไร กรณี PM ไม่อนุมัติงาน
- การผ่านแบบมีเงื่อนไข
- การขอลดล็อก กรณีผ่านแบบมีเงื่อนไข


ภาพรวมกระบวนการตรวจงวดงานเดิม/ใหม่

เดิม

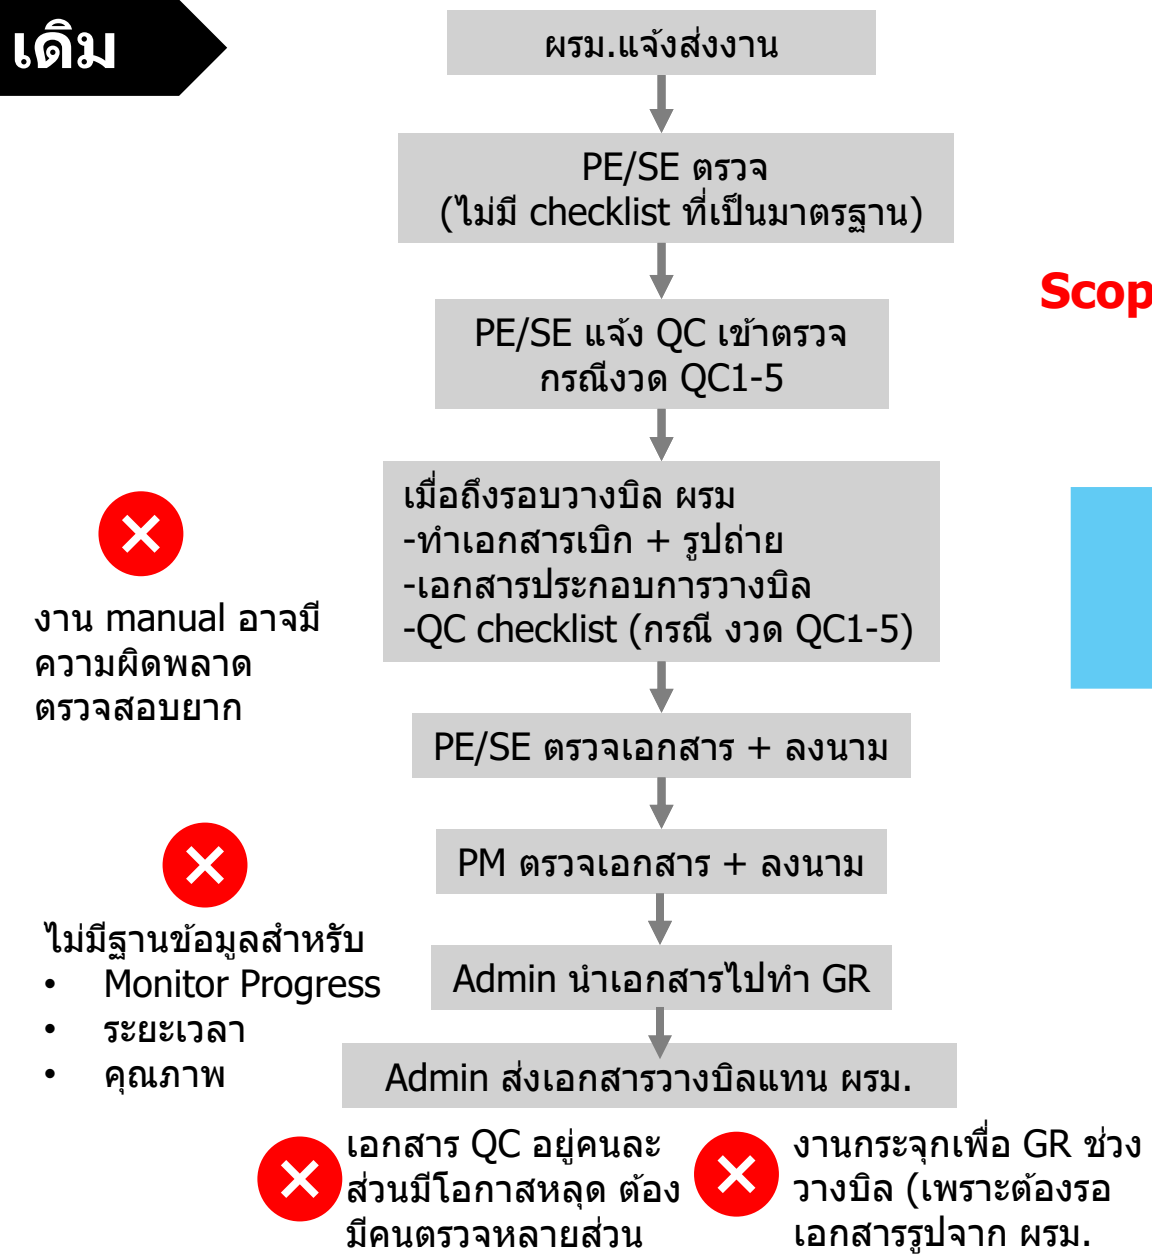


ใหม่

Scope วันนี้

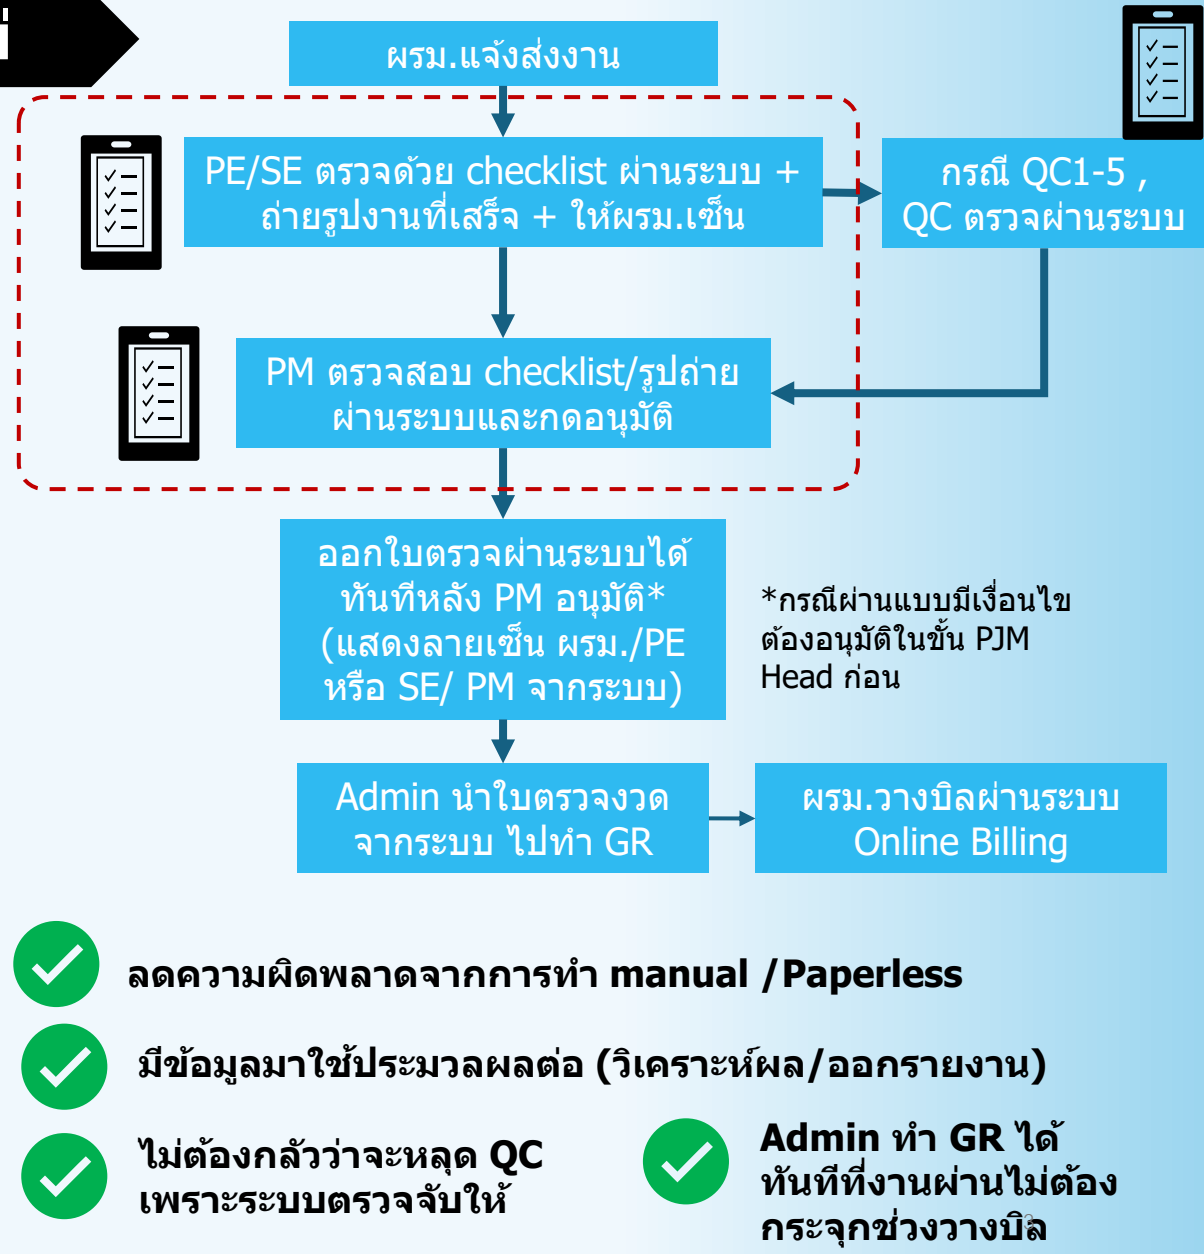


Overview Concept ของระบบตรวจงาน (CQT) 4

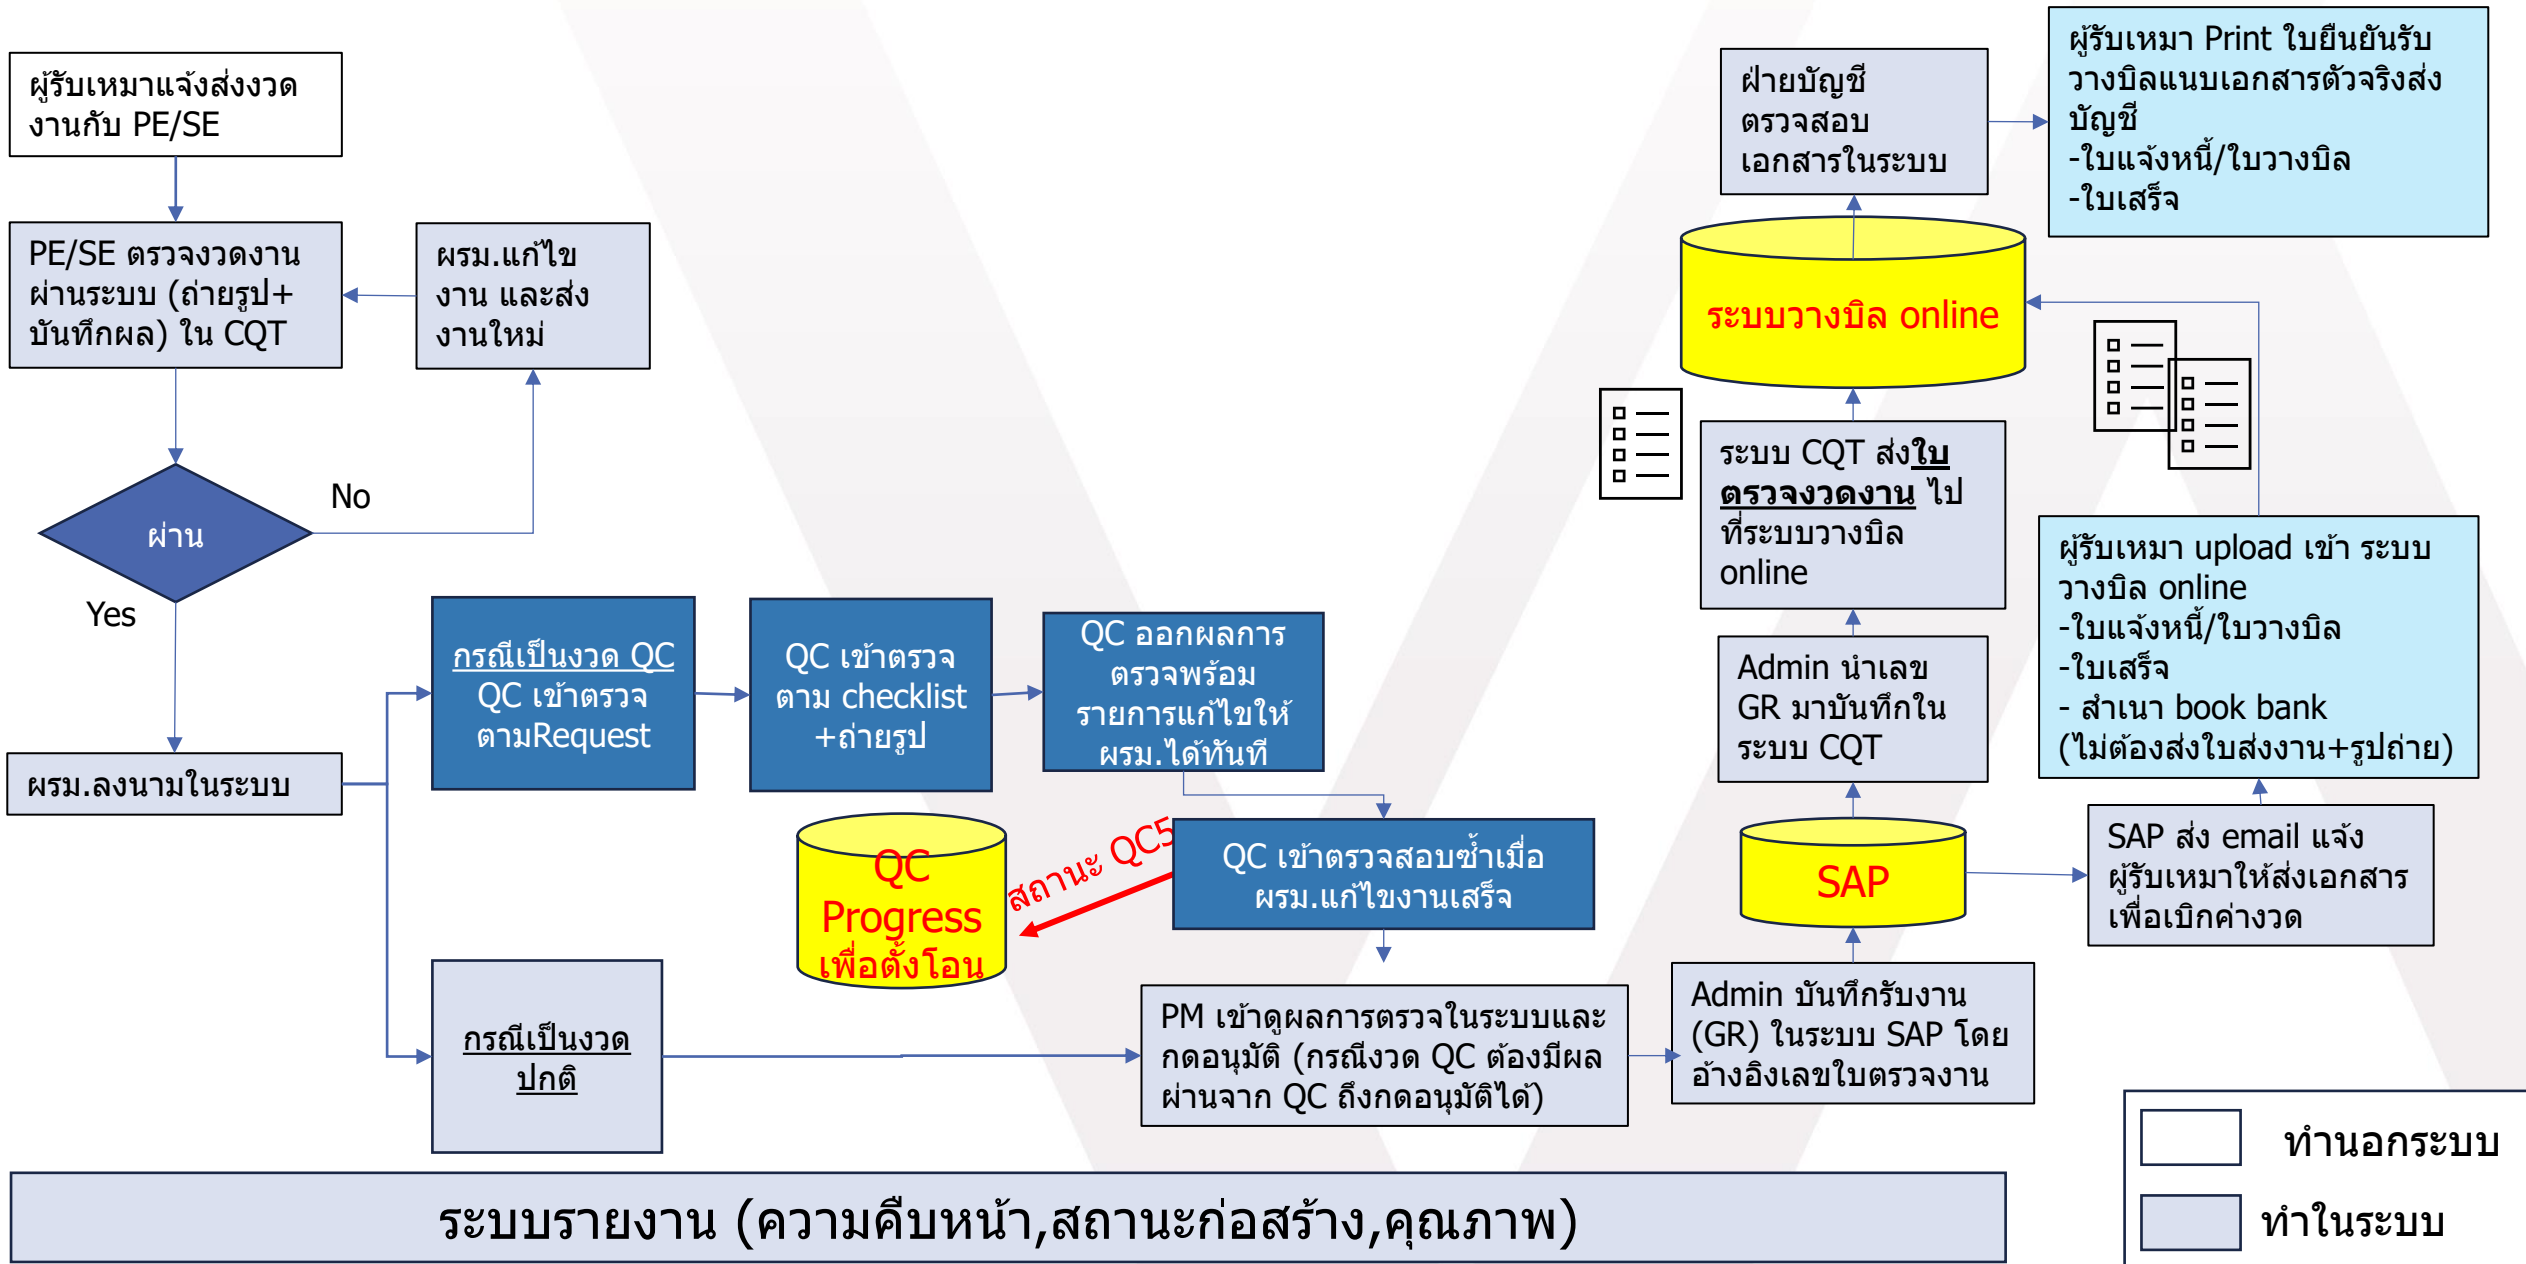


Flow การตรวจ

กรณี 1 : ส่งงานปกติ >> PM อนุมัติผ่าน

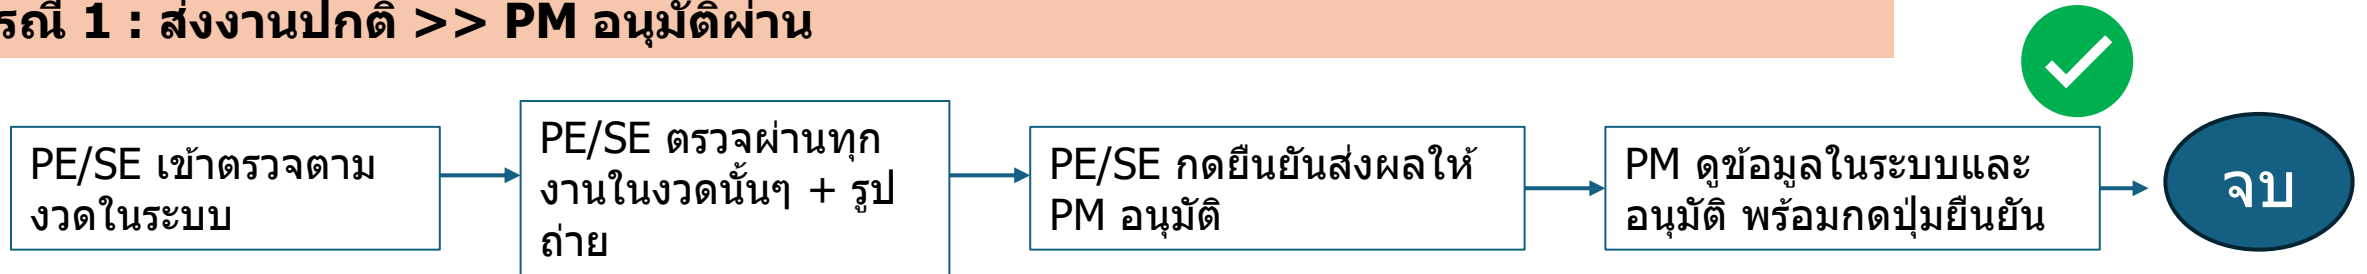


กรณี 2 : ส่งงานปกติ >> PM ไม่อนุมัติให้ผ่าน

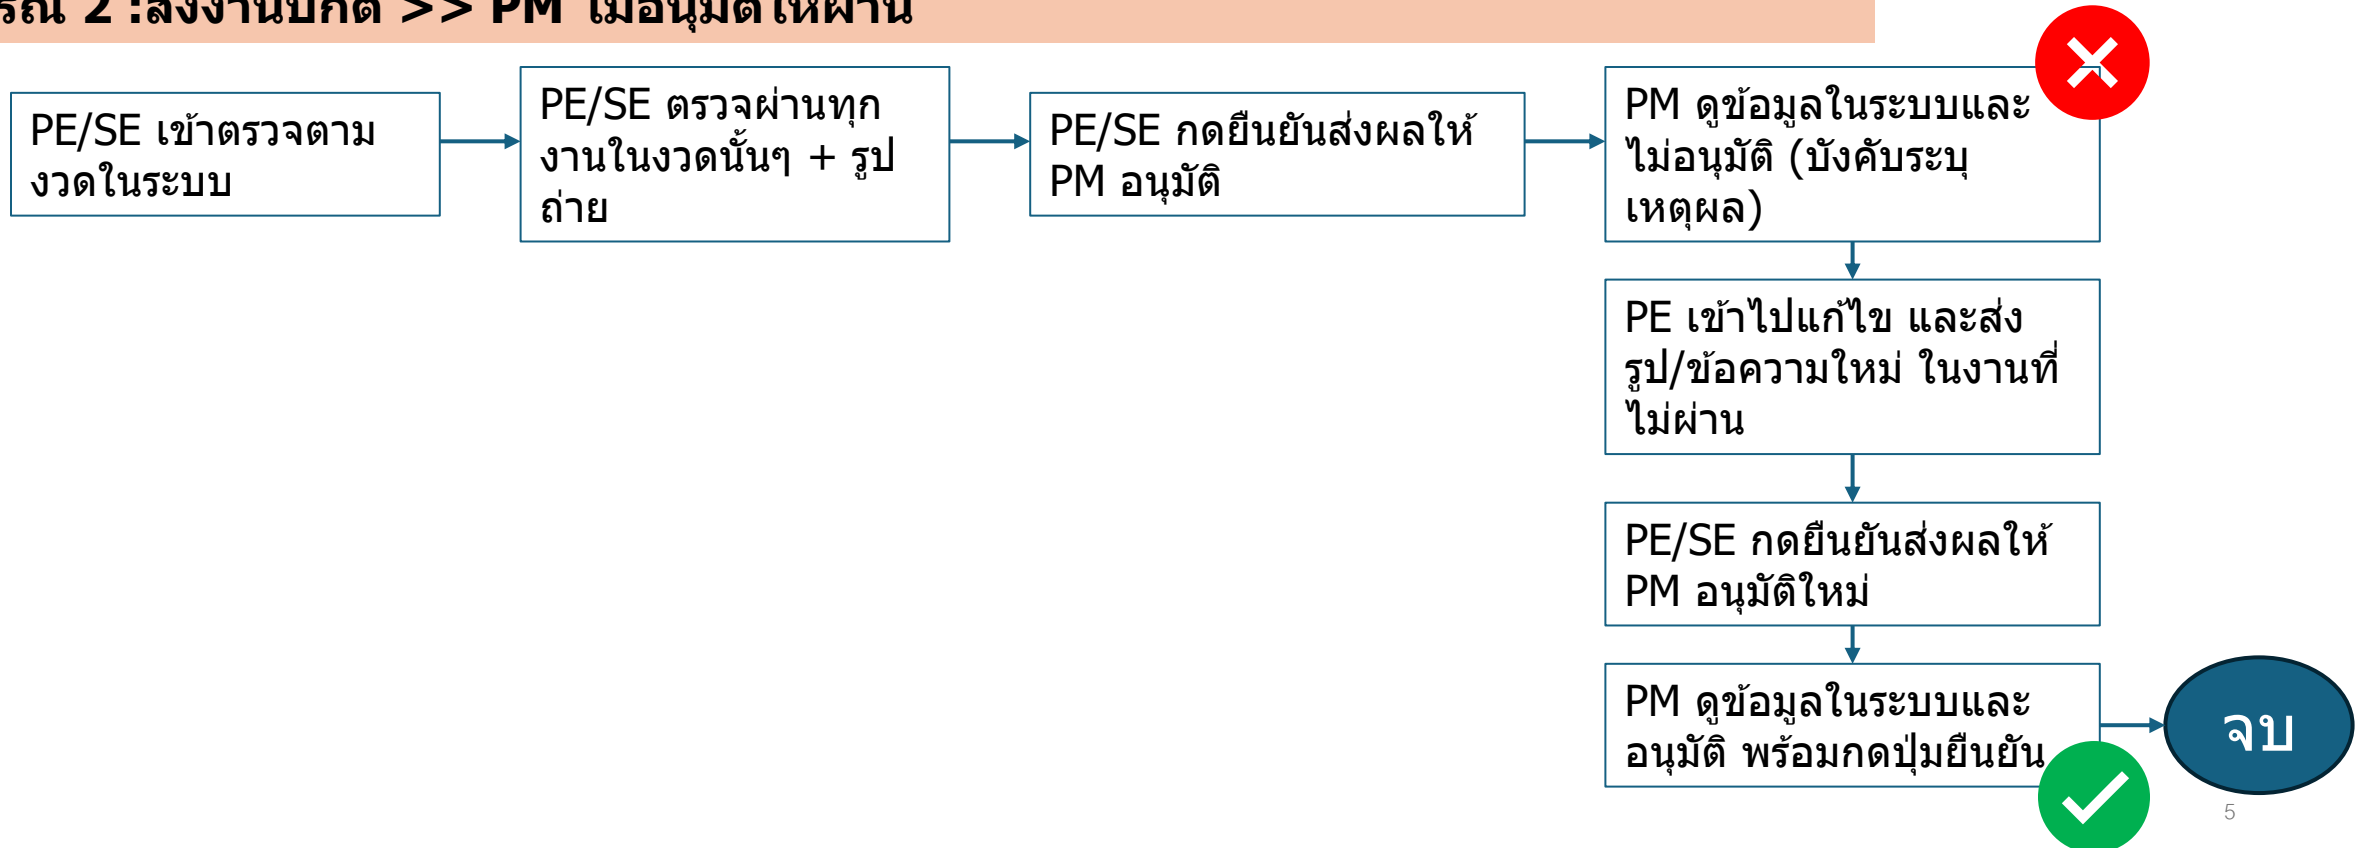


Flow การตรวจ

ผ่านแบบมีเงื่อนไข แล้ว PM,PJM Head อนุมัติ

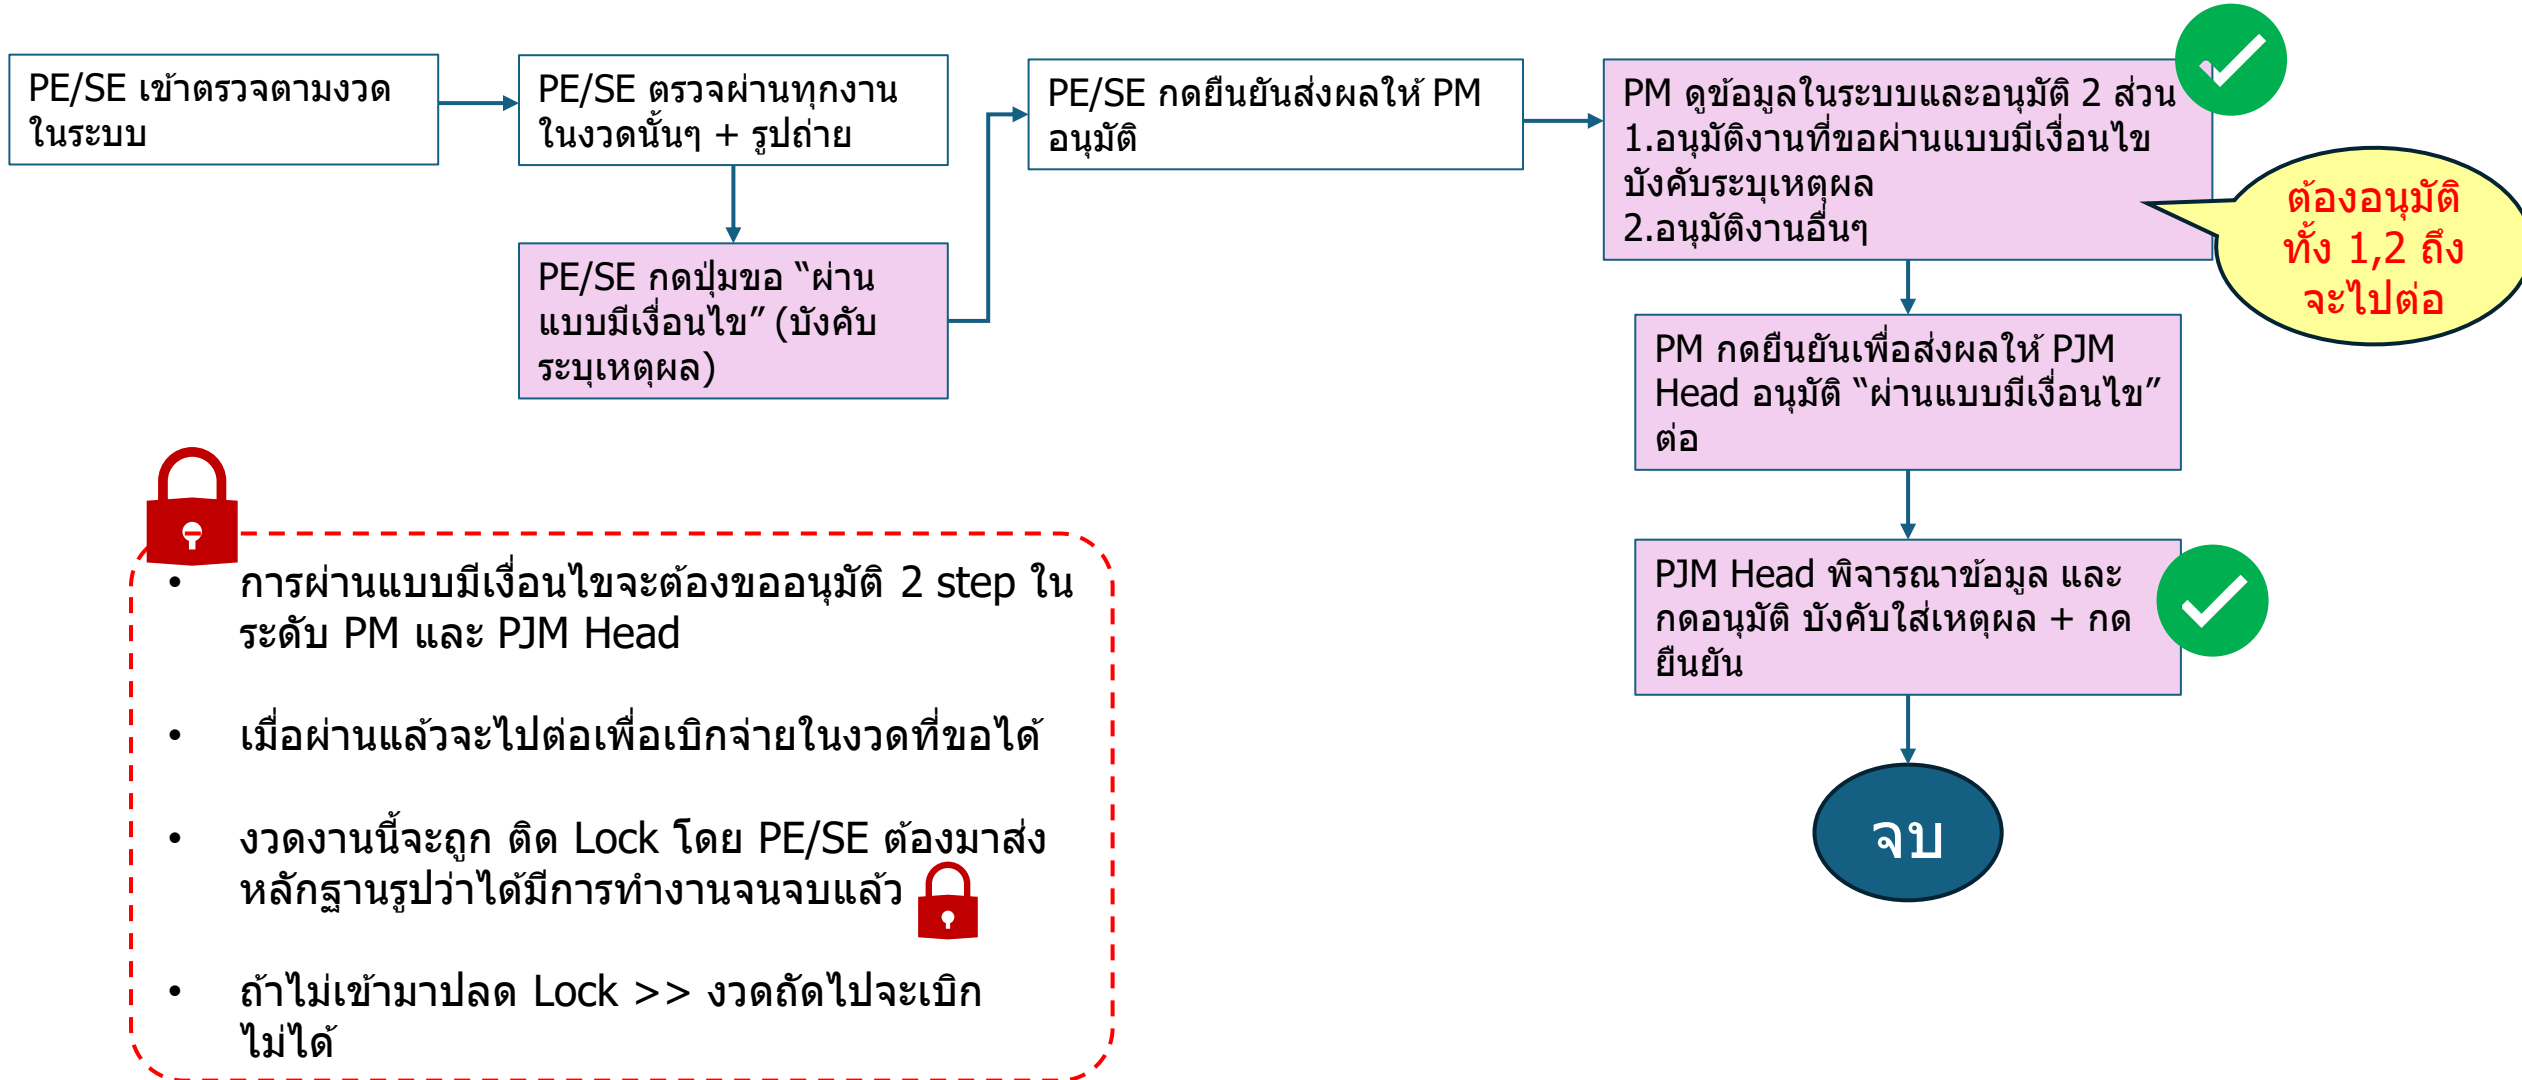

Flow การตรวจ

การขอปลดล็อค "การผ่านแบบมีเงื่อนไข"

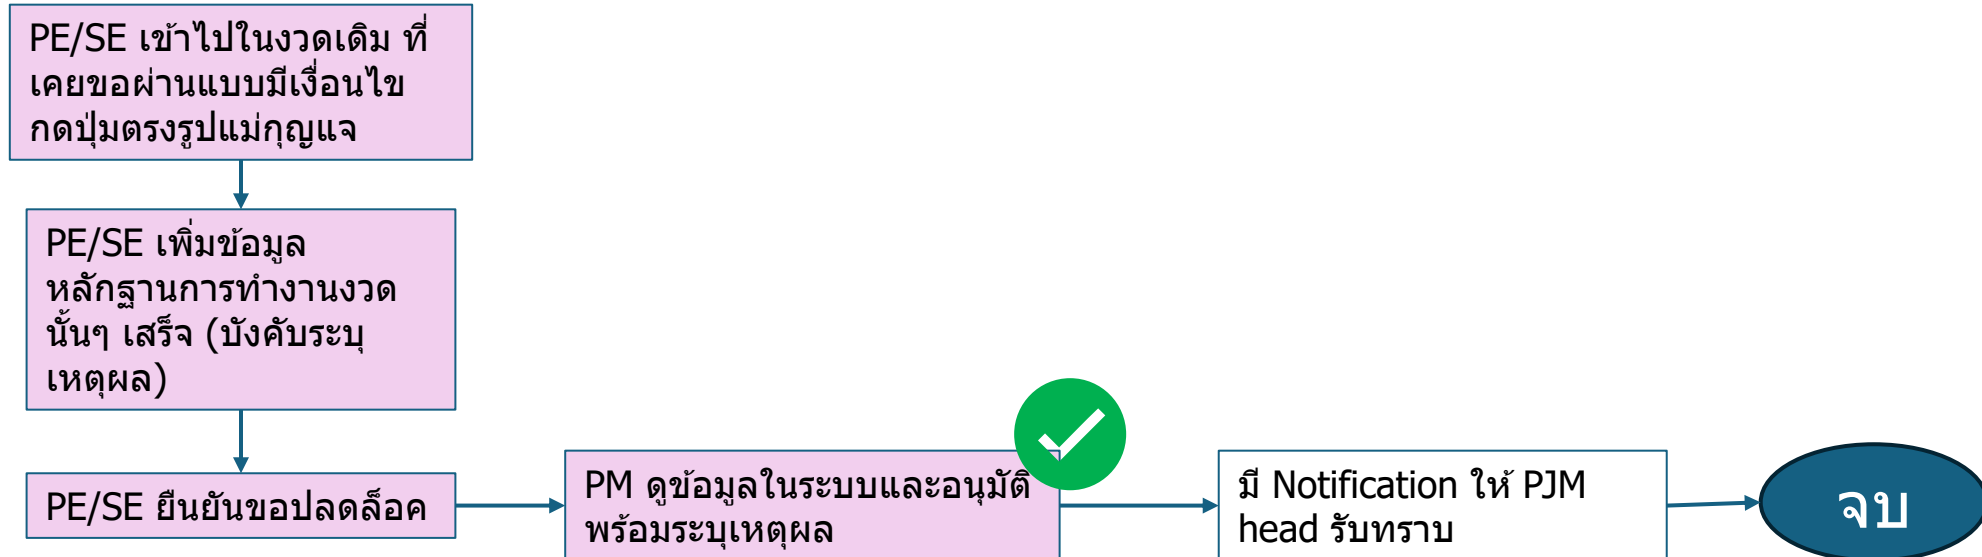

ASSETwise

Construction & Quality Tracking

Username

Password



Login with Microsoft

Login

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2567 บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด
(มหาชน)

<https://cqt.assetwise.co.th/cqt/>

Username = email

Password = เบอร์มือถือ

เมื่อเข้ามาหน้าแรกจะพบหน้า Project ให้ click ไปที่ profile ของตนเองก่อน

ASSET WISE

Dashboard Project My Task Desktop รายงาน

Profile Logout

ค้นหาโครงการ

พิมพ์ชื่อโครงการเพื่อค้นหา...

เอสต้า ซีรีนิตี้ บรมราชชนนี

ดี อาเบอร์ รัมอินทรา-วัชรพล

ฅมาน เดอะ รีเวอร์ไซด์ บรมราชชนนี

ดี ออเนอร์ โยธินพัฒนา

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2567 บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) All rights reserved.

[Go Back](#)

Edit User

ชื่อ	นามสกุล
ชลิตี	ปรัชญาลันต์
อีเมลล์	หมายเลขโทรศัพท์
challineePE	
BU	
SE	
ตำแหน่ง	Role
Position 1	PE/SE
รหัสผ่าน	ยืนยันรหัสผ่าน

[เพิ่มลายเซ็น](#)[แสดงรูปภาพลายเซ็น](#)

1

ให้เข้ามาเพิ่มลายเซ็นในระบบก่อน
เพื่อใช้ในการออกเอกสารตรวจ
ต่างๆ

ลายเซ็นในกรอบที่กำหนด จากนั้น
กด "บันทึก"

ลายเซ็นผู้รับมอบ

2

3

[← เลิก](#) [✓ บันทึก](#)

4

กด "บันทึก" อีกครั้งในหน้าหลัก

บันทึก

วิธีการตรวจวัดงาน สำหรับ PE/SE

ไปที่หน้า Project ให้ click โครงการที่รับผิดชอบ (จะเห็นโครงการตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้)

ASSET
WiSe

ชลธิ์ ปรียาพันธุ์
PE/SE

Dashboard Project My Task Desktop รายงาน



ค้นหาโครงการ

พิมพ์ชื่อโครงการเพื่อค้นหา...



เอสต้า ซีรีนิตี้ บรมราชชนนี



ดี อาเบอร์ รามอินทรา-วัชรพล



ฅมาน เดอะ รีเวอร์ไซด์ บรมราชชนนี



ดี ออเนอร์ โยธินพัฒนา



ค้นหา Unit โครงการ เอสต้า ชีรินดี บรมราชชนนี

เลือกยูนิต...

เลือกสถานะ...



AA001

สถานะ :ว่าง

ยังไม่เริ่มตรวจ



AA002

สถานะ :ว่าง

ยังไม่เริ่มตรวจ



AA003

สถานะ :ว่าง

ยังไม่เริ่มตรวจ



AA004

สถานะ :ว่าง

ยังไม่เริ่มตรวจ



AA005

สถานะ :ว่าง

ยังไม่เริ่มตรวจ



AA007



AA008



AA009



AA010



AA011

เลือก unit ที่จะเข้าตรวจ
โดยสามารถ click โดย
ตรงที่ unit นั้นๆ หรือ
search จากด้านบนได้

- หน้าจอนี้ จะแสดงงวดงานทั้งหมดของ unit นี้
- แต่ละงวดจะมีผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องคือ PE/SE, QC และ PM
- ส่วนของ PE/SE ให้คลิก ปุ่มแรกของงวดที่ต้องการเข้าตรวจ

สถานะการตรวจงาน Unit : AA002 เลสด้า ชวีรัตน์ บรมราชชนนี (สถานะ : วาง)			
งวดที่ 1	PE	QC1	PM
งวดที่ 2	PE		PM
งวดที่ 3	PE		PM
งวดที่ 4	PE	QC	PM
งวดที่ 5	PE		PM
งวดที่ 6	PE		PM
งวดที่ 7	PE		PM
งวดที่ 8	PE		PM
งวดที่ 9	PE	QC4	PM
งวดที่ 10	PE		PM
งวดที่ 11	PE		PM
งวดที่ 12	PE	QC5	PM



ส่วนที่ 3 : ช่องให้ประเมินคุณภาพงานในงวดนี้ของผู้รับเหมา (ทำหลังจากที่ตรวจสอบทุกงานแล้ว)

ส่วนที่ 1 : แสดงสถานะการทำงาน



ประเมินคุณภาพการทำงานในงวด

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

PE/SE ผู้ควบคุมงาน

ทำรายการโดย :

บริษัทผู้รับเหมา

บริษัท ทรัพย์มณี999 จำกัด

เลือกผู้รับเหมา

ลงลายเซ็นผู้รับเหมา

ส่วนที่ 4 : ช่องเลือกชื่อ ผู้คุมงานของผู้รับเหมา และช่องสำหรับผู้คุมงานของผู้รับเหมาลงนามรับทราบผลการตรวจ

← เคลียร์



PE/SE ยืนยัน



PM กำลังตรวจ

ดูรายละเอียด



PM อนุมัติผ่าน



งานฐานราก

รายการทั้งหมด 10 / ผ่านแล้ว 0 / ไม่ผ่าน 0



งานคานชั้นล่าง

รายการทั้งหมด 9 / ผ่านแล้ว 0 / ไม่ผ่าน 0



งานเสาชั้นล่าง

รายการทั้งหมด 8 / ผ่านแล้ว 0 / ไม่ผ่าน 0



งานเดินท่อกำจัดปlovก

รายการทั้งหมด 8 / ผ่านแล้ว 0 / ไม่ผ่าน 0

ส่วนที่ 2 : งานที่อยู่ในงวดนั้นๆ ที่จะต้องตรวจให้ click ที่ปุ่มแวนขยายเพื่อเข้าตรวจ

ขั้นตอนการเข้าตรวจ

งวดที่ 1 (Unit : AA002) เอสต้า ซีรีนดี บรมราชชนนี (สถานะ : วาง)

ประเมินคุณภาพการทำงานในงวด

A B C D

PE/SE ผู้ควบคุมงาน

ทำรายการโดย :

บริษัทผู้รับเหมา

บริษัท ททรัพย์มณี999 จำกัด

เลือกผู้รับเหมา

ลงลายเซ็นผู้รับเหมา

PE/SE ยืนยัน

PM กำลังตรวจ
ดูรายละเอียด

PM อนุมัติผ่าน

งานฐานราก

รายการทั้งหมด 10 / ผ่านแล้ว 0 / ไม่ผ่าน 0

งานเสาชั้นล่าง

รายการทั้งหมด 8 / ผ่านแล้ว 0 / ไม่ผ่าน 0

งานคานชั้นล่าง

รายการทั้งหมด 9 / ผ่านแล้ว 0 / ไม่ผ่าน 0

งานเดินท่อกำจัดปลวก

รายการทั้งหมด 8 / ผ่านแล้ว 0 / ไม่ผ่าน 0

1 Click ที่ แวนขยายของงานที่ต้องการตรวจ

☰ ส่วนที่ 1 รายการขออนุมัติการทำงาน

ตัดเสาเข็ม

☐ ผ่าน
 ☐ ไม่ผ่าน
 ☐ ไม่มีงานนี้

Pile deviate

☐ ผ่าน
 ☐ ไม่ผ่าน
 ☐ ไม่มีงานนี้

Seismic test

☐ ผ่าน
 ☐ ไม่ผ่าน
 ☐ ไม่มีงานนี้

คอนกรีตหยาบ

☐ ผ่าน
 ☐ ไม่ผ่าน
 ☐ ไม่มีงานนี้

หัวเข็ม

☐ ผ่าน
 ☐ ไม่ผ่าน
 ☐ ไม่มีงานนี้

เหล็กเสริม-ลูกปูน

☐ ผ่าน
 ☐ ไม่ผ่าน
 ☐ ไม่มีงานนี้

ระยะ-ขนาด-ระดับ

☐ ผ่าน
 ☐ ไม่ผ่าน
 ☐ ไม่มีงานนี้

1 ใส่ผลการตรวจ จนครบทุกข้อ
ระหว่างทางถ้ายังตรวจไม่เสร็จ
สามารถบันทึกไว้ก่อนได้

ความคิดเห็น ส่วนที่ 1 รายการขออนุมัติการทำงาน

ความคิดเห็น

☰ ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบ

ระดับหลังฐานราก

☐ ผ่าน
 ☐ ไม่ผ่าน
 ☐ ไม่มีงานนี้

ผิวคอนกรีต

☐ ผ่าน
 ☐ ไม่ผ่าน
 ☐ ไม่มีงานนี้

ความแข็งแรงคอนกรีต (ตาม strength ผู้ออกแบบ)

☐ ผ่าน
 ☐ ไม่ผ่าน
 ☐ ไม่มีงานนี้

ความคิดเห็น ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบ

บันทึกการตรวจ

กรุณาอัปโหลดไฟล์รูปภาพ



2 บังคับแนบรูปถ่ายของงานที่เสร็จด้วยทุกครั้ง โดยใน 1 งานจะต้องมี
อย่างน้อย 1 รูป (รูปจะไปแสดงบนเอกสารตรวจสำหรับทำเบิก)

กรณีผ่านแบบมีเงื่อนไขใส่ข้อมูลด้านล่าง

☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข (PC)

ระบุเหตุผลเพื่อขออนุมัติการผ่านแบบมีเงื่อนไข

ทำรายการโดย :

บันทึก

Checklist ประกอบด้วย 2
ส่วนคือ
1.ส่วนขออนุมัติการทำงาน :
ตรวจความพร้อมก่อนพรม.เริ่ม
ทำงาน

2.ส่วนรายการตรวจสอบ :
ตรวจหลังจากตรวจเสร็จแล้ว

ยังตรวจงานไม่ครบ



ประเมินคุณภาพการทำงานในงวด

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

PE/SE ผู้ควบคุมงาน

ทำรายการโดย :ชลธิ์ ปรียาสันติ 19-Dec-2024 10:38

บริษัทผู้รับเหมา

บริษัท ทรัพย์มณี999 จำกัด

เลือกผู้รับเหมา

ลงลายเซ็นผู้รับเหมา



PE/SE ยืนยัน



PM กำลังตรวจ

ดูรายละเอียด



PM อนุมัติผ่าน

3



งานฐานราก

รายการทั้งหมด 10 / ผ่านแล้ว 10 / ไม่ผ่าน 0



งานเสาชั้นล่าง

รายการทั้งหมด 8 / ผ่านแล้ว 0 / ไม่ผ่าน 0



งานคานชั้นล่าง

รายการทั้งหมด 9 / ผ่านแล้ว 0 / ไม่ผ่าน 0



งานเดินท่อกำจัดปลวก

รายการทั้งหมด 8 / ผ่านแล้ว 0 / ไม่ผ่าน 0

เมื่อตรวจสอบเสร็จ งานนั้นจะมีสัญลักษณ์สีเขียวขึ้น โดยให้ตรวจสอบจนครบทุกงาน

4

เมื่อตรวจสอบทุกงาน
แล้ว ให้ PE/SE ทำ
การประเมินผู้รับเหมา

5

เลือกชื่อผู้คุมงานของ
ผู้รับเหมา (ที่มีการ set
ไว้ในระบบมาก่อน ถ้า
เปลี่ยนหรือเพิ่มชื่อ ให้
แจ้ง Admin เพื่อเพิ่ม
ชื่อก่อน)

เลือกชื่อโดย เคาะ
space 1 ครั้ง จะมี
รายชื่อขึ้นมาให้เลือก

6

ให้ผู้คุมงานของ พรม.ลงนาม จากนั้น
กด “ยืนยัน”
(สามารถบันทึกร่างไว้ได้ก่อน และกด
ยืนยันภายหลังได้)

ยังไม่ได้ Submit

 ประเมินคุณภาพการทำงานในงวด

☐ A
 ☒ B
 ☐ C
 ☐ D

PE/SE ผู้ควบคุมงาน

ทำรายการโดย :ชลิณี ปรียาณาสันติ 19-Dec-2024 10:41

บริษัทผู้รับเหมา

บริษัท ทรัพย์มณี999 จำกัด

เลือกผู้รับเหมา

คุณนิยม โสวรรณ

คุณเชมภูษ โสวรรณ

6

⬅️เคลียร์

 PE/SE ยืนยัน

 PM กำลังตรวจ ดูรายละเอียด

 PM อนุมัติผ่าน

✔️ งานฐานราก

รายการทั้งหมด 10 / ผ่านแล้ว 10 / ไม่ผ่าน 0

✔️ งานคานชั้นล่าง

รายการทั้งหมด 9 / ผ่านแล้ว 9 / ไม่ผ่าน 0

✔️ งานเสาชั้นล่าง

รายการทั้งหมด 8 / ผ่านแล้ว 8 / ไม่ผ่าน 0

✔️ งานเดินท่อกำจัดปลวก


รายการทั้งหมด 8 / ผ่านแล้ว 8 / ไม่ผ่าน 0

บันทึกร่าง

เขียนใหม่


ยืนยัน

7 เมื่อกด ยืนยัน ระบบจะขึ้นข้อความให้
ยืนยันอีกครั้ง กด "ใช่"

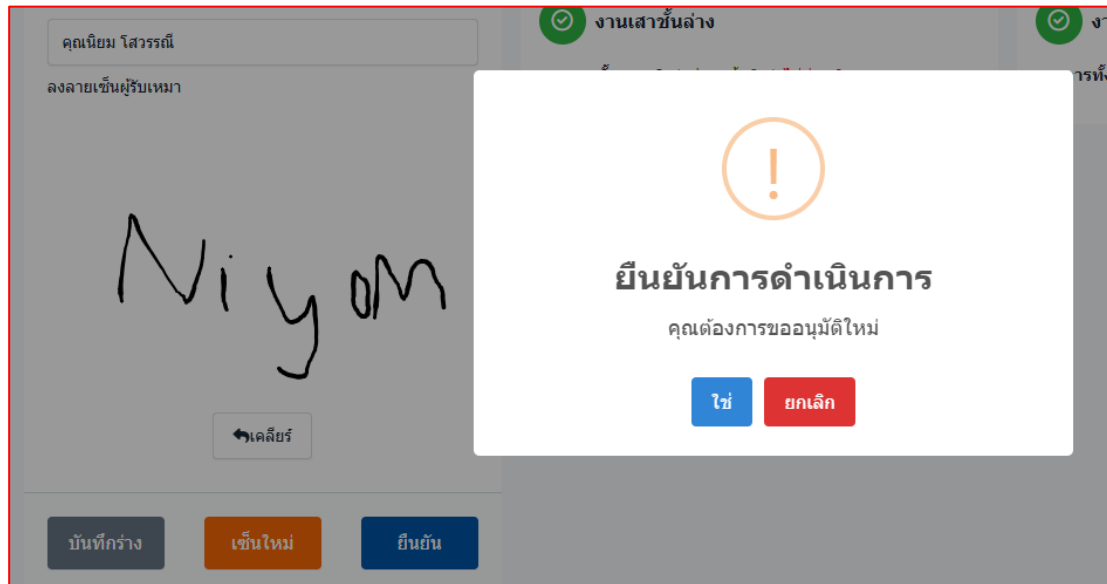

8

รายการจะถูกส่งไปรอที่ PM เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ

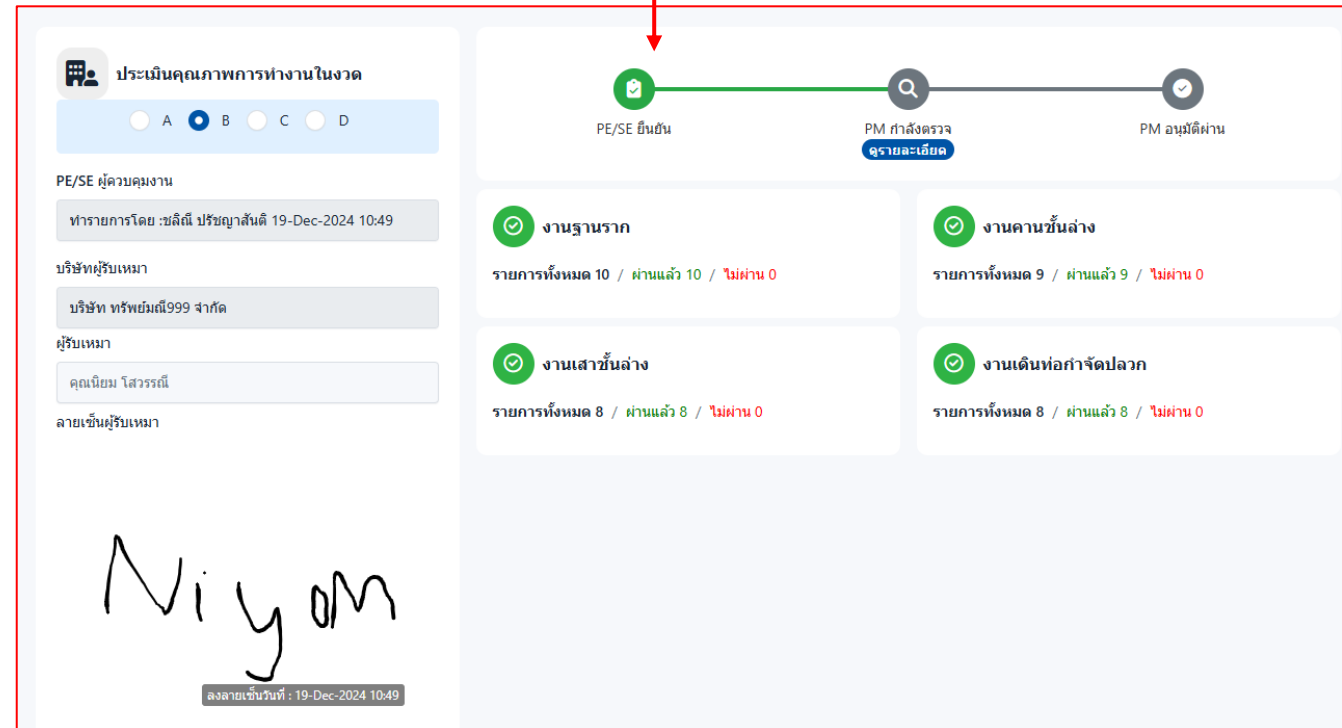

วิธีการอนุมัติงาน โดย PM

1

เมื่อ PM log in เข้ามาในระบบแล้ว ระบบจะแสดงหน้าแรกคือ หน้า "My task"

Al
wise



PM Admin
PM

Dashboard Project **My Task** Desktop รายงาน Setting Log out

รายการรออนุมัติ

จะมีรายการรออนุมัติจากการตรวจโดย PE/SE รอให้พิจารณา เข้าไปดูโดยกดที่ แวนขยาย

เลือกโครงการ

-- เลือกทั้งหมด

เลือกยูนิต

เลือก Unit...

เลือกสถานะ

เลือกสถานะ...



2



AA002 เอสต้า ซีรีนิตี้ บรมราชชนนี : งวดที่ 1

สร้างโดย / บริษัท ทรัพย์มณี999 จำกัด

สถานะ / รออนุมัติจาก PM

PE/SE ขออนุมัติ / ชลธิณี ปรัชญาสันติ 19-Dec-2024 10:49



AA029 เอสต้า ซีรีนิตี้ บรมราชชนนี : งวดที่ 12

สร้างโดย / บริษัท ปิยะสวัสดิ์ จำกัด

สถานะ / รออนุมัติจาก PM

PE/SE ขออนุมัติ / วีระพันธ์ ฉายเนตร 07-Dec-2024 10:29



AA030 เอสต้า ซีรีนิตี้ บรมราชชนนี : งวดที่ 12

สร้างโดย / บริษัท อีโอดี กรุ๊ป จำกัด

สถานะ / รออนุมัติจาก PM

PE/SE ขออนุมัติ / วีระพันธ์ ฉายเนตร 07-Dec-2024 10:27



AA032 เอสต้า ซีรีนิตี้ บรมราชชนนี : งวดที่ 12

สร้างโดย / บริษัท ปิยะสวัสดิ์ จำกัด

สถานะ / รออนุมัติจาก PM

PE/SE ขออนุมัติ / วีระพันธ์ ฉายเนตร 07-Dec-2024 10:29



AA035 เอสต้า ซีรีนิตี้ บรมราชชนนี : งวดที่ 6

สร้างโดย / บริษัท อีโอดี กรุ๊ป จำกัด

สถานะ / รออนุมัติจาก PM

PE/SE ขออนุมัติ / วีระพันธ์ ฉายเนตร 17-Dec-2024 13:15




AA036 เอสต้า ซีรีนิตี้ บรมราชชนนี : งวดที่ 8

สร้างโดย / บริษัท ปิยะสวัสดิ์ จำกัด

สถานะ / รออนุมัติจาก PM

PE/SE ขออนุมัติ / วีระพันธ์ ฉายเนตร 17-Dec-2024 13:22



ข้อมูลรายละเอียด

PE/SE ผู้ควบคุมงาน : ชลธิณี ปรัชญาสันติ
เกรดงวดนี้ : B
วันที่ส่งงาน : 19-Dec-2024 10:41
การตรวจ : **Q QCI - ยังไม่ได้ตรวจ**
สร้างโดย : บริษัท ทรัพย์มณี999 จำกัด
ชื่อผู้รับเหมาเข้า : คุณนิยม โสวรรณ

ลายเซ็นผู้รับเหมา

Niyom

3

งานฐานราก

ความเห็นจาก PE/SE

ส่วนที่ 1 รายการขออนุมัติการทำงาน :
ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบ :

งานคานชั้นล่าง

ความเห็นจาก PE/SE

ส่วนที่ 1 รายการขออนุมัติการทำงาน :
ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบ :


งานเสาชั้นล่าง

ความเห็นจาก PE/SE

ส่วนที่ 1 รายการขออนุมัติการทำงาน :
ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบ :

4

Click เพื่อดูเฉพาะรูปที่ PE/SE
แนบมาแต่ละงานได้

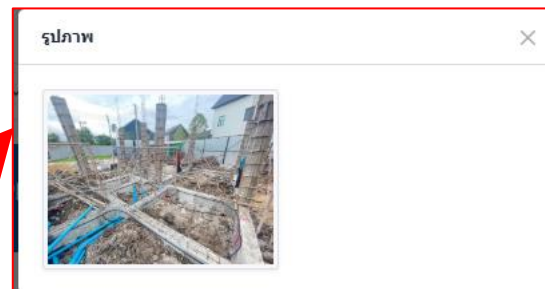

ตรวจสอบ : งานเสาชั้นล่าง งานที่ 1 (Unit : AA002)

ส่วนที่ 1 รายการขออนุมัติการทำงาน

เหล็กเสริม-จุดบัพ ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ไม่มีการวัด

ขนาด ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ไม่มีการวัด

ระดับ ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ไม่มีการวัด

ตั้ง ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ไม่มีการวัด

ความแข็งแรง ส่วนที่ 1 รายการขออนุมัติการทำงาน

ความแข็งแรง

ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบ

ตั้ง-ระดับหัวเสา ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ไม่มีการวัด

ผิวคอนกรีต ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ไม่มีการวัด

เหล็กยึดโบว์-ทับหลัง ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ไม่มีการวัด

ความแข็งแรงคอนกรีต (ตาม strength ปู่อกแบบ) ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ไม่มีการวัด

ความแข็งแรง ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบ

ความแข็งแรง

Click เพื่อดูในหน้าตรวจของ
PE/SE ได้ (view only)

บันทึกผลการอนุมัติในงวดนี้

กดอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ (กรณีไม่อนุมัติ ให้ระบุว่าจะงานไหนไม่ผ่าน เนื่องจากสาเหตุอะไร โดยสามารถแนบรูปเพิ่มเติมได้)

5

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

ทำรายการโดย :

6

บันทึกร่าง ยืนยัน

กด "ยืนยัน"
(สามารถบันทึกร่างไว้ได้ก่อน และกดยืนยันภายหลังได้)

สำคัญ : ถ้า PM จะกดไม่อนุมัติ จะต้องใส่เหตุผลว่าไม่อนุมัติที่ "งานใด" "สาเหตุใด" ด้วย มิฉะนั้น PE/SE จะไม่ทราบว่าต้องแก้ไขที่จุดใด

กรณี PM กดอนุมัติ (และ QC ผ่านแล้ว) เอกสารตรวจงวดงานจะแสดงขึ้นมาเพื่อนำไปใช้ประกอบการเบิกงวดงานได้

ASSET Wise

เลขที่ใบตรวจ: C400H0070712-018				
โครงการ	เขตฯ ชีวินดี นครราชสีมา	วันที่ 2024-12-20 15:54		
แผนก	AA002	การตรวจ QC	☐	ฝ่ายการตรวจจาก QC แล้ว
ผู้รับมอบ	บริษัท ทวีวัฒน์2009 จำกัด		☒	กรณีไม่มีการตรวจ QC
ผู้ควบคุมงาน	ชลธิ์ ปริญญาพันธ์			
งานที่ 8	งานตามแผนภาพผล 100% โครงสร้างตามแบบที่ขึ้น 100%และงานระบบประปาที่ส่งให้-ส่งให้			
รายการตรวจ		ผลการตรวจ		ความเห็น
งานตามแผนภาพผล 100%		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ส่วนที่ 1 รายการของวัสดุ ผลการดำเนินงาน	โครงเหล็ก	✓		
	ปูน เติมน (รวม-สี-ขาว)	✓		
	เสาเข็ม	✓		
	ทรายถม	✓		
ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบ	ดิน-ทรายถม	✓		
	แนว-ดิน	✓		
	ค่าระดับ + 1.00 ม. (เส้นระดับ OFF-METRE)	✓		
งานโครงสร้างตามแบบที่ขึ้น				
ส่วนที่ 1 รายการของวัสดุ ผลการดำเนินงาน	SPCC	✓		
ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบ	ระดับ	✓		
	ระดับ	✓		
งานประปาที่ส่งให้-ส่งให้				
ส่วนที่ 1 รายการของวัสดุ ผลการดำเนินงาน	SPCC	✓		
	ทราย-ทรายถม	✓		
ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบ	ค่าระดับ-ระดับ-ระดับ	✓		
	ระดับ-ระดับ-ระดับ	✓		
	ค่าระดับ-ระดับ-ระดับ	✓		
	ค่าระดับ-ระดับ-ระดับ	✓		

รูปถ่ายงานที่เสร็จแล้ว

งานตามแผนภาพผล 100%

Niyam
(ผู้รับมอบ
(คุณสม ไชยรัตน์))

(ผู้ควบคุมงาน
(ชลธิ์ ปริญญาพันธ์))

PM
Project Manager
(PM Admin)

Quality Control (QC)
()

ASSET Wise

เลขที่ใบตรวจ: C400H0070712-018				
โครงการ	เขตฯ ชีวินดี นครราชสีมา	วันที่ 2024-12-20 15:54		
แผนก	AA002	การตรวจ QC	☐	ฝ่ายการตรวจจาก QC แล้ว
ผู้รับมอบ	บริษัท ทวีวัฒน์2009 จำกัด		☒	กรณีไม่มีการตรวจ QC
ผู้ควบคุมงาน	ชลธิ์ ปริญญาพันธ์			
งานที่ 8	งานตามแผนภาพผล 100% โครงสร้างตามแบบที่ขึ้น 100%และงานระบบประปาที่ส่งให้-ส่งให้			
รายการตรวจ		ผลการตรวจ		ความเห็น
งานตามแผนภาพผล 100%		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ส่วนที่ 1 รายการของวัสดุ ผลการดำเนินงาน	โครงเหล็ก	✓		
	ปูน เติมน (รวม-สี-ขาว)	✓		
	เสาเข็ม	✓		
	ทรายถม	✓		
ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบ	ดิน-ทรายถม	✓		
	แนว-ดิน	✓		
	ค่าระดับ + 1.00 ม. (เส้นระดับ OFF-METRE)	✓		
งานโครงสร้างตามแบบที่ขึ้น				
ส่วนที่ 1 รายการของวัสดุ ผลการดำเนินงาน	SPCC	✓		
ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบ	ระดับ	✓		
	ระดับ	✓		
งานประปาที่ส่งให้-ส่งให้				
ส่วนที่ 1 รายการของวัสดุ ผลการดำเนินงาน	SPCC	✓		
	ทราย-ทรายถม	✓		
ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบ	ค่าระดับ-ระดับ-ระดับ	✓		
	ระดับ-ระดับ-ระดับ	✓		
	ค่าระดับ-ระดับ-ระดับ	✓		
	ค่าระดับ-ระดับ-ระดับ	✓		

งานโครงสร้างตามแบบที่ขึ้น



Niyam
(ผู้รับมอบ
(คุณสม ไชยรัตน์))

(ผู้ควบคุมงาน
(ชลธิ์ ปริญญาพันธ์))

PM
Project Manager
(PM Admin)

Quality Control (QC)
()

ทำอย่างไร กรณี PM ไม่อนุมัติงาน

ในกรณีที่ PM กดไม่ให้ผ่าน ในงานที่ PE/SE ส่งไป ระบบจะแสดงผลเป็นสีแดงในช่องสถานะ และในหน้า Unit ที่จะแสดงเป็นสีแดง

PM ตรวจสอบ งานที่ 1

PE/SE ยื่นขึ้น PM ไม่อนุมัติผ่าน PM อนุมัติผ่าน

ข้อมูลรายละเอียด

PE/SE ผู้ควบคุมงาน : ชลธิ์ ประยูรสันติ
เกรดงาน : B
วันที่ส่งงาน : 19-Dec-2024 10:41
การตรวจ : QQC1 - ยังไม่ได้ตรวจ
สร้างโดย : บริษัท ทรัพย์มณี 999 จำกัด
ชื่อผู้รับเหมา : คุณนิยม โสวรรณ

ลายเซ็นผู้รับเหมา

Niyom

งานฐานราก
ความเห็นจาก PE/SE

งานคานชั้นล่าง
ความเห็นจาก PE/SE

งานเสาชั้นล่าง
ความเห็นจาก PE/SE

งานเดินท่อกำจัดปลวก
ความเห็นจาก PE/SE

ASSET WISE

Dashboard Project My Task Desktop รายงาน

สถานะการตรวจงาน Unit : AA

งวดที่ 1	PE	QC1	PM
งวดที่ 3	PE		PM
งวดที่ 5	PE		PM
งวดที่ 7	PE		PM
งวดที่ 9	PE	QC4	PM

ช่องทางที่ PE/SE จะเห็นงานที่ส่ง PM ไปแล้ว
อนุมัติหรือไม่ ให้ดูที่หน้า My Task

ASSET WISE

ขลิณี ปรียาสนันติ
PE/SE

Dashboard Project **My Task** Desktop รายงาน

รายการขออนุมัติ

เลือกโครงการ: -- เลือกทั้งหมด -- เลือกยูนิต: เลือก Unit... เลือกสถานะ: เลือกสถานะ... 🔍

**AA002** เอสต้า ซีรินดี บรมราชชนนี : งวดที่ 1

สร้างโดย / บริษัท ททรัพย์มณี999 จำกัด
สถานะ / **PM ไม่อนุมัติ**
PM ผู้ตรวจ / PM Admin 19-Dec-2024 11:35

1

งานที่ PM ไม่อนุมัติจะแสดงสถานะสีแดง
ให้ click เข้าไปตรงสัญลักษณ์กลมสีแดง

<

งวดที่ 1 (Unit : AA002)

เดสค๊า ซิริณัติ บรรณราชชนนี (สถานะ : วาง)

ยังไม่ได้ Submit

ประเมินคุณภาพการทำงานในงวด

A

B

C

D

PE/SE ผู้ควบคุมงาน

ทำการการโดย :ชลิณี ปรียานุสันดี 19-Dec-2024 10:49

บริษัทผู้รับเหมา

บริษัท ทรัพย์มณี999 จำกัด

ผู้รับเหมา

คุณนิยม โสวรรณ

ลายเซ็นผู้รับเหมา

Niyom

ลงลายเซ็นวันที่ : 19-Dec-2024 10:49

PE/SE ยืนยัน

PM ไม่อนุมัติผ่าน

ดูรายละเอียด

PM อนุมัติผ่าน

งานฐานราก

รายการทั้งหมด 10 / ผ่านแล้ว 10 / ไม่ผ่าน 0

งานคานชั้นล่าง

รายการทั้งหมด 9 / ผ่านแล้ว 9 / ไม่ผ่าน 0

งานเสาชั้นล่าง

รายการทั้งหมด 8 / ผ่านแล้ว 8 / ไม่ผ่าน 0

งานเดินท่อกำจัดปลวก

รายการทั้งหมด 8 / ผ่านแล้ว 8 / ไม่ผ่าน 0

รูปภาพและคอมเม้น PM

ไม่มีรูปภาพ

PM/PJM ผู้ตรวจ

PM Admin

ล่าสุดวันที่

19-Dec-2024 11:35

หมายเหตุ

งานเดินท่อกำจัดปลวกยังไม่เรียบร้อย 19-Dec-2024 11:35

ดูว่า PM อนุมัติเพราะ
เหตุผลอะไร ให้เข้าไปดู
ตรง “ดูรายละเอียด”

2

29

← รายงาน : งานเดินท่อกำจัดปลวก งานที่ 1 (Unit : AA002)

ส่วนที่ 1 รายการขออนุมัติการทำงาน

SPEC ท่อ และอุปกรณ์โศลิน

☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ไม่มีงาน

SPEC น้ำยา และปริมาณ

☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ไม่มีงาน

ความคิดเห็น ส่วนที่ 1 รายการขออนุมัติการทำงาน

ความคิดเห็น

ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบ

ตำแหน่ง

☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ไม่มีงาน

ระดับ

☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ไม่มีงาน

จุดยึด

☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ไม่มีงาน

ท่อเติมน้ำยา

☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ไม่มีงาน

Spray ทิ้งทิ้ง ไม่หลุด

☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ไม่มีงาน

น้ำยา และ ปริมาณน้ำยาที่เติมตามมาตรฐาน

☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ไม่มีงาน

ความคิดเห็น ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบ

ทำการแก้ไข ชื่อและทำใบใน งานเดินท่อกำจัดปลวกเรียบร้อยแล้ว

บันทึกการตรวจ





กรณีผ่านแบบมีเงื่อนไขใส่ข้อมูลด้านล่าง

☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข (PC)

ระบุจุดและเพื่อขออนุมัติการทำงานแบบมีเงื่อนไข

ทำการแก้ไข : ชลสิทธิ์ ปิณฑาสันต์ 19-Dec-2024 10:41

บันทึก

← งานที่ 1 (Unit : AA002) แสดงข้อมูล งานราชการชน (สถานะ : ว่าง)

ยังไม่ได้ Submit

ประเมินคุณภาพการทำงานในงวด

A B C D

PE/SE ผู้ควบคุมงาน

ทำการแก้ไข ชลสิทธิ์ ปิณฑาสันต์ 19-Dec-2024 11:40

บริษัทผู้รับเหมา

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ 999 จำกัด

ผู้รับเหมา

คุณนิยม โสวรรณ

ลายเซ็นผู้รับเหมา



สถานะเซ็นวัน : 19-Dec-2024 10:49

บันทึกร่าง

PE/SE ยืนยัน

PM ไม่อนุมัติผ่าน

PM อนุมัติผ่าน

งานฐานราก

รายการทั้งหมด 10 / ผ่านแล้ว 10 / ไม่ผ่าน 0

งานคานชั้นล่าง

รายการทั้งหมด 9 / ผ่านแล้ว 9 / ไม่ผ่าน 0

งานเสาชั้นล่าง

รายการทั้งหมด 8 / ผ่านแล้ว 8 / ไม่ผ่าน 0

งานเดินท่อกำจัดปลวก

รายการทั้งหมด 8 / ผ่านแล้ว 8 / ไม่ผ่าน 0

กลับไปหน้างานแล้วกด
ยืนยันอีกรอบ รายการจะวิ่ง
กลับไป PM ใหม่เพื่อให้อนุมัติ
อีกครั้ง

- เมื่อ PE/SE ทราบสาเหตุแล้ว ให้ทำการแก้ไขงาน
ที่มีปัญหา จากนั้นให้ดำเนินการในระบบดังนี้
- เข้าไปหน้างาน
- เข้าไปที่ "งาน" ที่มีปัญหา
- ใส่ comment แจ้งว่าดำเนินการแก้ไขแล้ว
- แบบรูปใหม่ แล้วกดบันทึก

← งานที่ 1 (Unit : AA002) แสดงข้อมูล งานราชการชน (สถานะ : ว่าง)

ประเมินคุณภาพการทำงานในงวด

A B C D

PE/SE ผู้ควบคุมงาน

ทำการแก้ไข ชลสิทธิ์ ปิณฑาสันต์ 19-Dec-2024 11:42

บริษัทผู้รับเหมา

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ 999 จำกัด

ผู้รับเหมา

คุณนิยม โสวรรณ

ลายเซ็นผู้รับเหมา



สถานะเซ็นวัน : 19-Dec-2024 10:49

PE/SE ยืนยัน

PM ผ่านตรวจสอบ

PM อนุมัติผ่าน

งานฐานราก

รายการทั้งหมด 10 / ผ่านแล้ว 10 / ไม่ผ่าน 0

งานคานชั้นล่าง

รายการทั้งหมด 9 / ผ่านแล้ว 9 / ไม่ผ่าน 0

งานเสาชั้นล่าง

รายการทั้งหมด 8 / ผ่านแล้ว 8 / ไม่ผ่าน 0

งานเดินท่อกำจัดปลวก

รายการทั้งหมด 8 / ผ่านแล้ว 8 / ไม่ผ่าน 0

รายการอนุมัติ

เลือกโครงการ

-- เลือกทั้งหมด --

เลือกยูนิต

เลือก Unit...

เลือกสถานะ

เลือกสถานะ...



AA029 เอสต้า ซีรินดี บรมราชชนนี : งวดที่ 12

สร้างโดย / บริษัท ปิยะสวัสดิ์ จำกัด

สถานะ / **รออนุมัติจาก PM**

PE/SE ขออนุมัติ / วีระพันธ์ ฉายเนตร 07-Dec-2024 10:29



AA030 เอสต้า ซีรินดี บรมราชชนนี : งวดที่ 12

สร้างโดย / บริษัท อีโอดี กรุ๊ป จำกัด

สถานะ / **รออนุมัติจาก PM**

PE/SE ขออนุมัติ / วีระพันธ์ ฉายเนตร 07-Dec-2024 10:27



AA032 เอสต้า ซีรินดี บรมราชชนนี : งวดที่ 12

สร้างโดย / บริษัท ปิยะสวัสดิ์ จำกัด

สถานะ / **รออนุมัติจาก PM**

PE/SE ขออนุมัติ / วีระพันธ์ ฉายเนตร 07-Dec-2024 10:29



AA035 เอสต้า ซีรินดี บรมราชชนนี : งวดที่ 6

สร้างโดย / บริษัท อีโอดี กรุ๊ป จำกัด

สถานะ / **รออนุมัติจาก PM**

PE/SE ขออนุมัติ / วีระพันธ์ ฉายเนตร 17-Dec-2024 13:15



AA036 เอสต้า ซีรินดี บรมราชชนนี : งวดที่ 8

สร้างโดย / บริษัท ปิยะสวัสดิ์ จำกัด

สถานะ / **รออนุมัติจาก PM**

PE/SE ขออนุมัติ / วีระพันธ์ ฉายเนตร 17-Dec-2024 13:22



AA042 เอสต้า ซีรินดี บรมราชชนนี : งวดที่ 6

สร้างโดย / ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พอเพียง รีโนเวท

สถานะ / **รออนุมัติจาก PM**

PE/SE ขออนุมัติ / วีระพันธ์ ฉายเนตร 17-Dec-2024 13:33



AA002 เอสต้า ซีรินดี บรมราชชนนี : งวดที่ 1

สร้างโดย / บริษัท ททรัพย์มณี999 จำกัด

สถานะ / **รออนุมัติจาก PM**

PE/SE ขออนุมัติ / ชลธิณี ปรัชญาสันติ 19-Dec-2024 11:42

- งานที่แก้ไขแล้วจาก PE/SE จะวิ่งมาที่ หน้า "My task" ของ PM โดยแสดงสัญลักษณ์ "reply"
- PM เข้าไปอนุมัติตามกระบวนการปกติ

การผ่านแบบมีเงื่อนไข

รายงาน : งานฉาบปูนภายนอก 100% งวดที่ 5 (Unit : AA002)

ส่วนที่ 1 รายการขออนุมัติการทำงาน

พรมน้ำ

☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ไม่มีงานนี้

ปูม เชื่อม (ระยะ-ตั้ง-ฉาก)

☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ไม่มีงานนี้

ลวดตาข่าย

☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ไม่มีงานนี้

ขนาดช่องเปิดประตู หน้าต่าง

☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ไม่มีงานนี้

ความคิดเห็น ส่วนที่ 1 รายการขออนุมัติการทำงาน

ความคิดเห็น

ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบ

ตั้ง-ฉาก-มุม

☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ไม่มีงานนี้

แนว-ผิว

☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ไม่มีงานนี้

ทุกระดับ + 1.00 ม. (เส้นระดับ OFF-METRE)

☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ไม่มีงานนี้

ความคิดเห็น ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบ

ความคิดเห็น

บันทึกการตรวจ

กรดยาอัปโหลดไฟล์รูปภาพ

กรณีผ่านแบบมีเงื่อนไขใส่ข้อมูลด้านล่าง

☒ ผ่านแบบมีเงื่อนไข (PC)

ขอผ่านแบบมีเงื่อนไขเนื่องจากวัสดุขาดแคลน และผู้รับเหมาได้ทำงานในงวดที่ 6 ไปเกือบเสร็จแล้ว

ทำรายการโดย :

บันทึก

1

เมื่อตรวจรายการทั้งหมดแล้ว
• Click ที่ “ผ่านแบบมีเงื่อนไข”
• ใส่เหตุผลที่อธิบายสาเหตุที่

การขอผ่านแบบมีเงื่อนไขคืออะไร (Pass with condition)

- การขอผ่านแบบมีเงื่อนไขคือการอนุมัติในการ
ตรวจงวดนั้นๆ ผ่านโดยที่ พรม.ยังดำเนินการใน
บางงานไม่เสร็จ
- ต้องมีเหตุผลวิสัย เช่น วัสดุขาดแคลน บริษัท
แจ้งให้ชะลองานก่อสร้าง โดยที่ พรม.ได้ก่อสร้าง
ในงวดงานอื่นๆ ล้ำหน้าไปแล้ว
- การขอผ่านแบบมีเงื่อนไขต้องผ่านการอนุมัติจาก
 - PM
 - PJM head

1 เมื่อตรวจรายการทั้งหมดแล้ว (โดยต้องตรวจผ่านทั้งหมด)

- Click ที่ “ผ่านแบบมีเงื่อนไข”
- ใส่เหตุผลที่อธิบายสาเหตุที่ต้องอนุมัติให้จ่ายในงวดนี้

ยังไม่ได้ Submit

ประเมินคุณภาพการทำงานในงวด

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

PE/SE ผู้ควบคุมงาน

ทำรายการโดย : ชลิตี ประญาสันต์ 20-Dec-2024 15:39

บริษัทผู้รับเหมา

บริษัท ทรัพย์มณี999 จำกัด

เลือกผู้รับเหมา

ลงลายเซ็นผู้รับเหมา



PE/SE ยืนยัน



PM ตรวจ

ดูรายละเอียด



PJM ตรวจ

ดูรายละเอียด



ขอปลดล็อค



ปลดล็อค



งานจบภายนอก 100%

รายการทั้งหมด 7 / ผ่านแล้ว 7 / ไม่ผ่าน 0
สถานะการผ่านแบบมีเงื่อนไข /

ความคิดเห็นการผ่านแบบมีเงื่อนไข:

ความเห็นจาก PE : ขอผ่านแบบมีเงื่อนไขเนื่องจากวัสดุขาดแคลน และผู้รับเหมาได้ทำงานในงวดที่ 6 ไปเกือบเสร็จแล้ว 20-Dec-2024 15:37
ความเห็นจาก PM :



งานโครงฝ้าชายคาภายนอกชั้นบน

รายการทั้งหมด 4 / ผ่านแล้ว 4 / ไม่ผ่าน 0

2

งานที่ขอผ่านแบบมีเงื่อนไข จะแสดง "สถานการณ์ผ่านแบบมีเงื่อนไข" พร้อมสัญลักษณ์แม่กุญแจ lock

3

กดยืนยันตามขั้นตอนปกติ จากนั้นรายการจะส่งไปที่ PM เพื่อขออนุมัติ

แถบ status จะขึ้นขั้นตอนของการอนุมัติโดย PJM และขั้นตอนการปลดล็อค

4

เมื่อ PE/SE กด submit แล้ว รายการจะส่งไปที่ PM
กรณีขออนุมัติผ่านแบบมีเงื่อนไข สังเกตได้จาก
สัญลักษณ์ แม่กุญแจ Lock ให้ click เข้าไปดูรายการ

PM Admin
PM

Dashboard Project My Task Desktop รายงาน Setting Log out

รายการอนุมัติ

เลือกโครงการ

-- เลือกทั้งหมด --

เลือกยูนิต

เลือก Unit...

เลือกสถานะ

เลือกสถานะ...



AA002 เอสต้า ซีรินดี้ บรมราชชนนี : งวดที่ 5



สร้างโดย / บริษัท ททรัพย์มณี999 จำกัด
สถานะ / รออนุมัติจาก PM
PE/SE ขออนุมัติ / ซลิตี ประญาสันติ 20-Dec-2024 15:42



AA029 เอสต้า ซีรินดี้ บรมราชชนนี : งวดที่ 12

สร้างโดย / บริษัท ปิยะสวัสดิ์ จำกัด
สถานะ / รออนุมัติจาก PM
PE/SE ขออนุมัติ / วีระพันธ์ ฉายเนตร 07-Dec-2024 10:29



AA030 เอสต้า ซีรินดี้ บรมราชชนนี : งวดที่ 12

สร้างโดย / บริษัท อัดโด กรุ๊ป จำกัด
สถานะ / รออนุมัติจาก PM
PE/SE ขออนุมัติ / วีระพันธ์ ฉายเนตร 07-Dec-2024 10:27



AA032 เอสต้า ซีรินดี้ บรมราชชนนี : งวดที่ 12

สร้างโดย / บริษัท ปิยะสวัสดิ์ จำกัด
สถานะ / รออนุมัติจาก PM
PE/SE ขออนุมัติ / วีระพันธ์ ฉายเนตร 07-Dec-2024 10:29



AA035 เอสต้า ซีรินดี้ บรมราชชนนี : งวดที่ 6

สร้างโดย / บริษัท อัดโด กรุ๊ป จำกัด
สถานะ / รออนุมัติจาก PM
PE/SE ขออนุมัติ / วีระพันธ์ ฉายเนตร 17-Dec-2024 13:15




AA036 เอสต้า ซีรินดี้ บรมราชชนนี : งวดที่ 8

สร้างโดย / บริษัท ปิยะสวัสดิ์ จำกัด
สถานะ / รออนุมัติจาก PM
PE/SE ขออนุมัติ / วีระพันธ์ ฉายเนตร 17-Dec-2024 13:22

หน้าจอ PM

มีการผ่านแบบมีเงื่อนไข!!!



ข้อมูลรายละเอียด

ลายเซ็นผู้รับเหมา

PE/SE ผู้ควบคุมงาน : ชลิตน์ ปรัชญาสันต์
เกรดงานนี้ : C
วันที่ส่งงาน : 20-Dec-2024 15:39
สร้างโดย : บริษัท ทรัพย์มณี999 จำกัด
ชื่อผู้รับเหมาเซ็น : คุณนิยม โสวรรณ

Niyom

งานลานปูนภายนอก 100%
ความเห็นจาก PE/SE

ส่วนที่ 1 รายการขออนุมัติการทำงาน :
ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบ :

งานโครงฝ้าขายคาภายนอกชั้นบน
ความเห็นจาก PE/SE

ส่วนที่ 1 รายการขออนุมัติการทำงาน :
ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบ :

งานประปา-ท่อน้ำดี-น้ำทิ้ง
ความเห็นจาก PE/SE

ส่วนที่ 1 รายการขออนุมัติการทำงาน :
ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบ :

ความเห็นจาก PE/SE กรณีผ่านแบบมีเงื่อนไข

ขอผ่านแบบมีเงื่อนไขเนื่องจากวัสดุขาดแคลน และผู้รับเหมาได้
ทำงานในงวดที่ 6 ไปเกือบเสร็จแล้ว 20-Dec-2024 15:37

อนุมัติการผ่านแบบมีเงื่อนไข

☒ ผ่านเพื่อส่ง PJM Head ☐ ไม่ผ่าน

ความเห็น PM ผ่านกรณีผ่านแบบมีเงื่อนไข

ให้ผ่านแบบมีเงื่อนไข เนื่องจากไม่ได้เป็นสาเหตุจากผู้รับเหมา
โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30/12/67

5

PM กดอนุมัติในส่วนของงานที่
ขอผ่านแบบมีเงื่อนไข โดยใส่
เหตุผลเพื่อส่งต่อให้ PJM
Head ในการอนุมัติต่อ

6

PM กดอนุมัติในภาพรวมของ
ทั้งงวด ตรงด้านล่างอีกครั้ง
จากนั้นกดยืนยัน
รายการจะวิ่งไปที่ PJM Head

บันทึกผลการอนุมัติในงวดนี้

☒ อนุมัติผ่านแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่อนุมัติ

ทำการการโดย :

บันทึกร่าง

ยืนยัน

หน้าจอ PJM Head

ASSET WISE

PJM PJM Head
PJM-Head

Dashboard Project **My Task** Desktop ▼ รายงาน ▼

รายการขออนุมัติผ่านงานแบบมีเงื่อนไข

เลือกโครงการ: -- เลือกทั้งหมด -- เลือกยูนิต: เลือก Unit... เลือกสถานะ: เลือกสถานะ... 🔍

🔍 AA002 เอสต้า ซีรีนดี้ บรมราชชนนี : งวดที่ 5 🔒

สร้างโดย / บริษัท ทรัพย์มณี999 จำกัด

สถานะ / **รออนุมัติจาก PJM**

PM ขออนุมัติ / PM Admin 20-Dec-2024 15:54

7

หน้าจอ My Task ของ PJM Head จะขึ้นรายการที่ขออนุมัติการผ่านแบบมีเงื่อนไข

ให้ Click เข้าดูรายการ

หน้าจอ PJM Head

< PJM อนุมัติผ่านแบบมีเงื่อนไข งวดที่ 5 เวลา 13:00 น. 20-Dec-2024 (Unit : AA002)

งานลบบนภายนอก 100%
ความเห็นจาก PE/SE

ขอผ่านแบบมีเงื่อนไขเนื่องจากวัสดุขาดแคลน และผู้รับเหมาได้
ทำงานในงวดที่ 6 ไปเกือบเสร็จแล้ว 20-Dec-2024 15:37

ความเห็นจาก PM

ให้ผ่านแบบมีเงื่อนไข เฉพาะในงวด 5 เท่านั้น โดยต้องดำเนินการ
ให้เสร็จภายใน 30/12/67 20-Dec-2024 15:54

อนุมัติการผ่านแบบมีเงื่อนไข

☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

ให้ผ่านแต่ต้องกำกับดูแลให้ทำเสร็จภายในกำหนด

บันทึกผลการอนุมัติผ่านแบบมีเงื่อนไขในงวดนี้

ทำรายการโดย :

หมายเหตุ



บันทึกสร้าง ยืนยัน

8

หน้าจอ จะแสดงความเห็นได้มา
ตั้งแต่ PE/SE , PM เพื่อเป็น
เหตุผลประกอบการพิจารณา
สำหรับ PJM Head

PJM Head กดอนุมัติ และใส่
เหตุผล

9

กดที่ "ยืนยัน"

หน้าจอ PE/SE

ASSET
WISE

Dashboard

Project

My Task

Desktop

รายงาน

รายการขออนุมัติ

เลือกโครงการ

-- เลือกทั้งหมด --

เลือกยูนิต

เลือก Unit...

เลือกสถานะ

เลือกสถานะ...

AA002 เอสต้า ซีรินดี้ บรมราชชนนี : งวดที่ 5

สร้างโดย / บริษัท ททรัพย์มณี999 จำกัด

สถานะ / **PJM อนุมัติแล้ว**

PM ผู้ตรวจ / PM Admin 20-Dec-2024 15:54

10

เมื่อเข้ามาดูสถานะ รายการที่ PJM อนุมัติแล้วจะขึ้นแม่กุญแจ lock สีเขียว หมายถึงผ่านแล้ว งวดนี้สามารถนำไปเบิกได้ตามปกติ

สถานะการตรวจงาน Unit : AA002

งวดที่ 1	PE	QC1	PM
งวดที่ 3	PE		PM
งวดที่ 5	PE		PM
งวดที่ 7	PE		PM
งวดที่ 9	PE	QC4	PM
งวดที่ 11	PE		PM

สำคัญ : PE/SE จะต้องนำข้อมูลหลักฐานการดำเนินการ“เสร็จ” ของงวดที่ขอผ่านแบบมีเงื่อนไข มาบันทึกเพื่อปลด lock ในระบบ มิฉะนั้น **ผู้รับเหมาจะไม่สามารถเบิกงวดถัดไปได้**

การขอปลดล็อค กรณีผ่านแบบมีเงื่อนไข

หน้าจอ PE/SE

PE/SE มีหน้าที่ต้องเข้ามา บันทึกข้อมูลของงวดงานที่เคย “ขอผ่านแบบมีเงื่อนไข” เพื่อปลดล็อก ในการเบิกของงวดถัดไป โดยจะต้องส่งให้ PM เป็นผู้กดอนุมัติ (PJM เป็นผู้รับทราบเท่านั้น)

<

สถานะการตรวจงาน Unit : AA002 เลสด้า ซีรีนดี้ นรม

งวดที่ 1	PE	QC1	PM	งวดที่ 2
งวดที่ 3	PE		PM	งวดที่ 4
งวดที่ 5	PE	PM		งวดที่ 6
งวดที่ 7				งวดที่ 8
งวดที่ 9	PE	QC4	PM	งวดที่ 10
งวดที่ 11	PE		PM	งวดที่ 12

1

Click เข้าไปที่สัญลักษณ์ แม่กุญแจสีเขียว



<

AA002 : งวดที่ 5 เลสด้า ซีรีนดี้ นรมราชชนนี

วิศวกรผู้ควบคุมงาน : ชลิตน์ ปรัชญาสันต์

PM โครงการ : PM Admin

PJM Head : pjm PJM Head

กลุ่มงาน : งานจางานภายนอก

100%

สถานะ : รอขอปลดล็อก

ความเห็นจาก PE

ขอผ่านแบบมีเงื่อนไขเนื่องจากวัสดุขาดแคลน 20-Dec-2024 16:21

ความเห็นจาก PM

อนุมัติ โดยต้องรับดำเนินการให้เสร็จทันตามกำหนด 20-Dec-2024 16:24

ความเห็นจาก PJM Head

อนุมัติ โดยดูแลในเรื่องวัสดุให้ทันตามกำหนดในงวดหน้า 20-Dec-2024 16:26

ระบบฯขอปลดล็อก

ระบุเหตุผลเพื่อขออนุมัติปลดล็อก

ความคิดเห็น PM

ขออนุมัติปลดล็อก

วิศวกรผู้ควบคุมงาน : ชลิตี ปรัชญาสันต์
PM โครงการ : PM Admin
PJM Head : pjim PJM Head

กลุ่มงาน : งานฉาบปูนภายนอก



100%

สถานะ : รอขอปลดล็อค

ความเห็นจาก PE

ขอผ่านแบบมีเงื่อนไขเนื่องจากวัสดุขาดแคลน 20-Dec-2024 16:21

ความเห็นจาก PM

อนุมัติ โดยต้องรีบดำเนินการให้เสร็จทันตามกำหนด 20-Dec-2024 16:24

ความเห็นจาก PJM Head

อนุมัติ โดยดูแลในเรื่องวัสดุให้ทันตามกำหนดในงวดหน้า 20-Dec-2024 16:26



ระบบฯขอปลดล็อค

ดำเนินการฉาบปูนแล้วเสร็จแล้ว ภายใน 30/12/67 ตามรูปแบบ

ความเห็นจาก PE

ขออนุมัติปลดล็อค

2

PE/SE ใส่รูป พร้อมใส่ คำขอปลดล็อค จากนั้นกด “ปุ่ม
ขออนุมัติปลดล็อค”

3

ASSET WISE

PM Admin
PM

Dashboard

Project

My Task

Desktop

รายงาน

Setting

Log out

รายการอนุมัติ

เลือกโครงการ

-- เลือกทั้งหมด --

เลือกยูนิต

เลือก Unit...

เลือกสถานะ

เลือกสถานะ...

🔍

🔍 AA001 เอสต้า ซีรีนดี้ บรมราชชนนี : งวดที่ 1

สร้างโดย / บริษัท บียะสวัสดิ์ จำกัด

สถานะ / **รออนุมัติจาก PM**

PE/SE ขออนุมัติ / ชลิต์ ปรัชญาสันติ 09-Dec-2024 15:19

🔍 AA035 เอสต้า ซีรีนดี้ บรมราชชนนี : งวดที่ 4

สร้างโดย / บริษัท อัดโด กรุ๊ป จำกัด

สถานะ / **รออนุมัติจาก PM**

PE/SE ขออนุมัติ / วีระพันธ์ ฉายเนตร 04-Dec-2024 09:36

🔍 AA042 เอสต้า ซีรีนดี้ บรมราชชนนี : งวดที่ 4

สร้างโดย / ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พอเพียง รีโนเวท

สถานะ / **รออนุมัติจาก PM**

PE/SE ขออนุมัติ / วีระพันธ์ ฉายเนตร 04-Dec-2024 09:55

🔍 AA043 เอสต้า ซีรีนดี้ บรมราชชนนี : งวดที่ 4

สร้างโดย / บริษัท ททรัพย์มณี999 จำกัด

สถานะ / **รออนุมัติจาก PM**

PE/SE ขออนุมัติ / วีระพันธ์ ฉายเนตร 04-Dec-2024 09:54

🔍 AA002 เอสต้า ซีรีนดี้ บรมราชชนนี : งวดที่ 5

สร้างโดย / บริษัท ททรัพย์มณี999 จำกัด

สถานะ / **PE/SE ขอปลดล็อค**

PE/SE ขออนุมัติ / ชลิต์ ปรัชญาสันติ 20-Dec-2024 16:23

4

ในหน้า My task ของ PM จะแสดงข้อมูลขออนุมัติ
ปลดล็อค การผ่านแบบมีเงื่อนไข (แสดงรูปแม่กุญแจ)
ให้ click เข้าไปดูข้อมูล

หน้าจอ PM

PM ครงงาน งวดที่ 5 เอกสาร : 5999999999999999 (Unit : AA002)

5

มีการผ่านแบบมีเงื่อนไข!!!

PE/SE ขึ้นต้น PM ลงบัญชีผ่าน PM ลงบัญชีผ่าน รอปลดล็อค **ปลดล็อค**

ข้อมูลรายละเอียด
PE/SE ผู้ควบคุมงาน : ชัยสิทธิ์ รัชตะกุลสันติ
เกรดงาน : C
วันที่ส่งงาน : 20-Dec-2024 16:22
สร้างโดย : บริษัท ทรัพย์สิน 999 จำกัด
ชื่อผู้รับมอบหมาย : คุณเชษฐา ใจธรรม
ดูเอกสารตรวจ

ลายเซ็นผู้รับมอบ

งานลงบัญชีภายนอก 100%
ความเห็นจาก PE/SE
ส่วนที่ 1 รายการขออนุมัติการทำงาน :
ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอน :
ความเห็นจาก PE/SE กรณีผ่านแบบมีเงื่อนไข
ขอผ่านแบบมีเงื่อนไขเนื่องจากวัสดุขาดแคลน 20-Dec-2024 16:21
อนุมัติการทำงานแบบมีเงื่อนไข
☒ ผ่านเพื่อส่ง PJM Head ☐ ไม่ผ่าน
ความเห็น PM ผ่านกรณีผ่านแบบมีเงื่อนไข
อนุมัติ โดยต้องรับดำเนินการให้เสร็จทันตามกำหนด 20-Dec-2024 16:24
PJM ลงบัญชีผ่านแบบมีเงื่อนไข
อนุมัติ โดยดูผลในเรื่องวัสดุให้ทันตามกำหนดในงวดหน้า 20-Dec-2024 16:25

บันทึกผลการอนุมัติในงวดนี้

☒ อนุมัติผ่านแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่อนุมัติ

คลิกที่ปุ่ม
"ปลดล็อค"



AA002 : งวดที่ 5

วิศวกรผู้ควบคุมงาน : นายสมชาย ใจดี
PM โครงการ : นายสุทธิชัย วงศ์ใหญ่
PJM Head : นายพรชัย แสงวงการ

กลุ่มงาน : งานงานปูนภายนอก
100%
สถานะ : รออนุมัติปลดล็อค

ความเห็นจาก PE
ขอผ่านแบบมีเงื่อนไขเนื่องจากวัสดุขาดแคลน 20-Dec-2024 16:21

ความเห็นจาก PM
อนุมัติ โดยต้องรับดำเนินการให้เสร็จทันตามกำหนด 20-Dec-2024 16:24

ความเห็นจาก PJM Head
อนุมัติ โดยดูผลในเรื่องวัสดุให้ทันตามกำหนดในงวดหน้า 20-Dec-2024 16:26



ความเห็น PE
ดำเนินการลงบัญชีแล้วเสร็จแล้ว ภายใน 30/12/67 ตามกำหนด 20-Dec-2024 16:34

ความคิดเห็น PM
อนุมัติ
ไม่อนุมัติปลดล็อค **อนุมัติปลดล็อค**

6

PM ใส่ความเห็น
และกดปุ่ม อนุมัติ
ปลดล็อค

หน้าจอ PE/SE

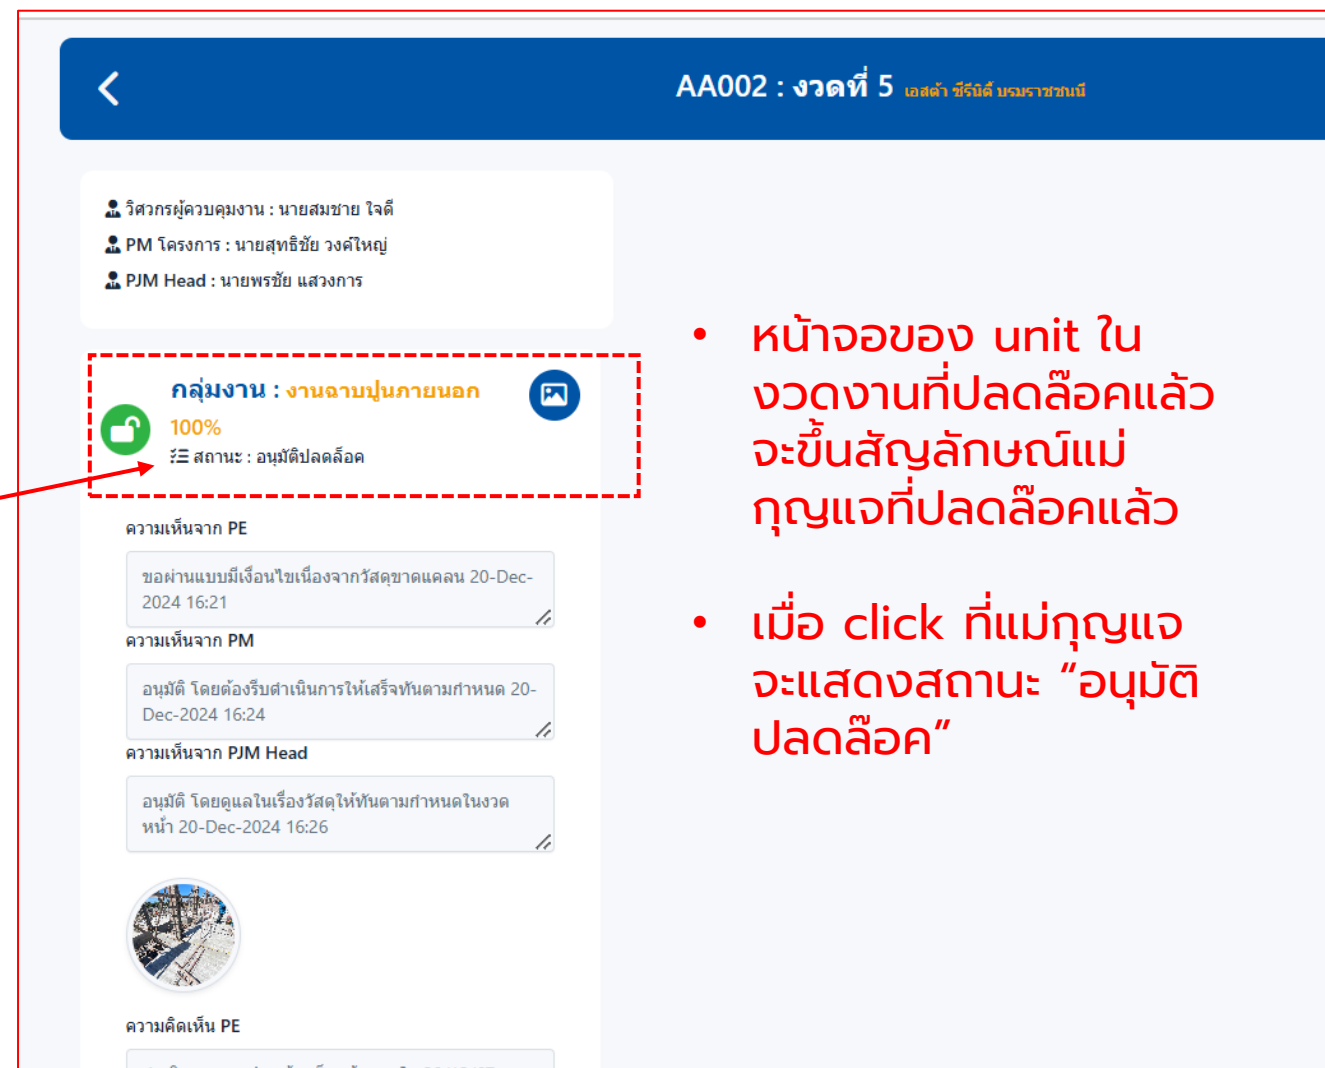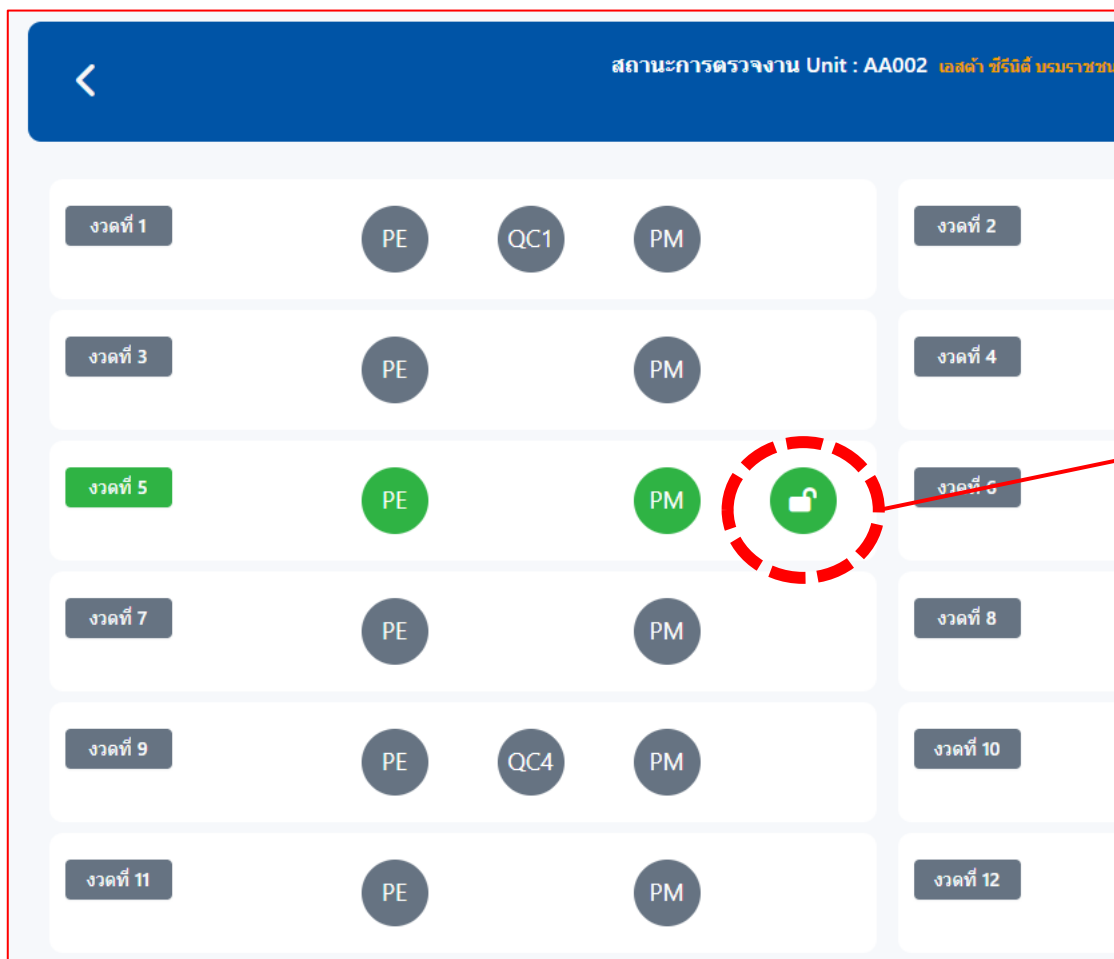

- หน้าจอของ unit ในงวดงานที่ปลดล็อคแล้วจะขึ้นสัญลักษณ์แม่กุญแจที่ปลดล็อคแล้ว
- เมื่อ click ที่แม่กุญแจจะแสดงสถานะ "อนุมัติปลดล็อค"

หน้าจอ PJM Head

- ในการปลดล็อค PJM head จะไม่ได้เป็นผู้กดอนุมัติปลดล็อค แต่จะมีสถานะแสดงให้เห็นในหน้าจอ My task เท่านั้น

ASSET WISE

pjm PJM Head
PJM-Head

Dashboard Project My Task Desktop รายงาน

รายการขออนุมัติผ่านงานแบบมีเงื่อนไข

เลือกโครงการ
เอสต้า ซีรีนิตี้ บรมราชชนนี

เลือกยูนิต
เลือก Unit...

เลือกสถานะ
เลือกสถานะ... 🔍

AA002 เอสต้า ซีรีนิตี้ บรมราชชนนี : งวดที่ 5

สร้างโดย / บริษัท ทรพยมณี999 จำกัด

สถานะ / **PM อนุมัติปลดล็อค**

PM ขออนุมัติ / PM Admin 20-Dec-2024 16:24
