


การ Set ระบบ CQT สำหรับ Admin

โครงสร้างระบบ Construction & Quality Tracking

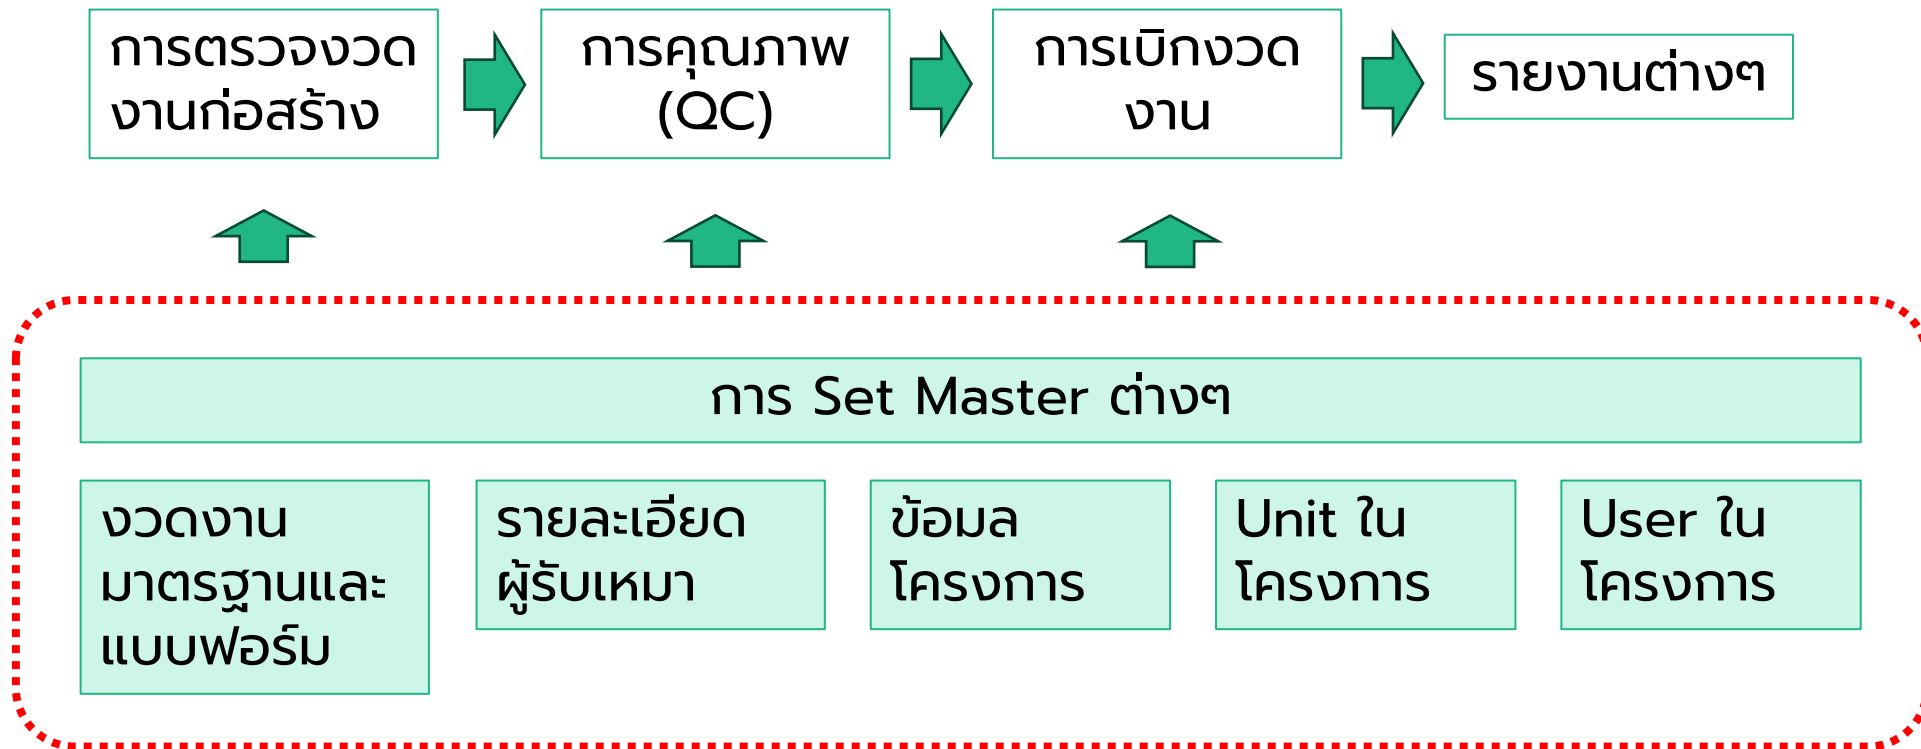

บทบาทของ Admin ระบบ

Set up ระบบ

- เพิ่มข้อมูลแบบฟอร์มใหม่ หรือแก้ไขแบบฟอร์มการตรวจของบ้าน (เฉพาะ % กับจำนวนวันต่องวด)
- สร้าง user ใหม่กรณีมีพนักงานใหม่ (User master)
- เพิ่มข้อมูลโครงการเมื่อมีโครงการใหม่ที่จะเริ่มใช้งานผ่านระบบ (Project master)
- เพิ่มข้อมูลใน Unit เมื่อมีการเริ่มก่อสร้างแปลงใหม่ (Unit master)
- เพิ่มข้อมูลผู้รับเหมาเมื่อมี ผู้รับเหมารายใหม่ (Vendor master)
- แก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้รับเหมาในแปลงเดิม (Unit master) เช่น ผู้รับเหมารายเดิมทิ้งงาน แล้วต้องเปลี่ยนผู้รับเหมาใหม่

บทบาทของ Admin โครงการ

นำข้อมูล เลข GR จาก SAP มากรอกในระบบในงวดที่ผ่านการตรวจจาก PE/SE/PM แล้ว

สิ่งที่ต้องมีพร้อมสำหรับการใช้งานระบบ (เริ่มโครงการใหม่)

Form Master

- ❑ มีแบบฟอร์มตรวจของบ้านที่สร้างในโครงการ

Project Master

- ❑ มีโครงการ (กรณีโครงการใหม่ให้แจ้ง IT เพื่อนำเข้าข้อมูลก่อน)

Project Master

- ❑ มีการผูกแบบบ้านกับแบบฟอร์มตรวจ

User Master

- ❑ มีการสร้าง user ของโครงการนั้นๆ ครอบคลุม role (PE/SE, PM,PJM,QC) โดยมีการสร้างลายเซ็นครบของทุกคน พร้อมระบุโครงการที่รับผิดชอบ

Vendor Master

- ❑ มีข้อมูลผู้รับเหมาที่สร้างในโครงการนั้นๆ (สร้างใน Vendor master)

Unit Master

- ❑ มีการผูก unit กับผู้รับเหมา ที่ใส่เลข PO สั่งจ้าง และกำหนดวันเริ่มงานของ unit นั้นๆ

Unit Master

- ❑ มีการกำหนด PE/SE ที่ดูแล unit

สิ่งที่ต้องมีพร้อมสำหรับการใช้งานระบบ (เพิ่ม unit ใหม่ในโครงการที่มีอยู่แล้ว)

Form Master

- ❑ ตรวจสอบว่ามีแบบฟอร์มตรวจของบ้าน type ที่จะขึ้นใหม่ในระบบหรือไม่ ถ้าไม่มีให้สร้างเพิ่มใน Form master

Project Master

- ❑ ตรวจสอบในหน้า Project Master ว่าแบบบ้านของแปลงนั้น ผูกกับแบบฟอร์มแล้ว

User Master

- ❑ ตรวจสอบ user ของโครงการนั้นๆ ครบทุก role (PE/SE, PM,PJM,QC) โดยมีการสร้างลายเซ็นครบของทุกคน พร้อมระบุโครงการที่รับผิดชอบ

Vendor Master

- ❑ ผู้รับเหมาที่สร้างของ unit นั้น ได้มีการ set ข้อมูลใน Vendor master แล้วหรือไม่

Unit Master


- ❑ ทำการผูก unit กับผู้รับเหมา พร้อมใส่เลข PO สั่งจ้าง และกำหนดวันเริ่มงานของ unit นั้นๆ (Unit Master)

Unit Master

- ❑ กำหนด PE/SE ที่ดูแล unit (Unit Master)

Type บ้าน vs แบบฟอร์มตรวจบ้าน อ้างอิงตามจำนวนชั้น และขนาด

โครงการ	แบบบ้าน	โครงการและแบบบ้าน	พื้นที่ก่อสร้าง	ประเภทมาตรฐาน	พื้นที่ก่อสร้าง	ระยะเวลาก่อสร้าง
The Honor	Type S	The Honor Type S	354.69	บ้าน 3 ชั้น	300-400 ตรม.	240 วัน
The Honor	Type M	The Honor Type M	462.03	บ้าน 3 ชั้น	400-600 ตรม.	270 วัน
The Honor	Type L	The Honor Type L	591.91	บ้าน 3 ชั้น	400-600 ตรม.	270 วัน
The Arbor DC	S (SH-2101)	The Arbor DC: S (SH-2101)	184.66	บ้าน 2 ชั้น	100-200 ตรม.	150 วัน
The Arbor DC	M (SH-2102)	The Arbor DC: M (SH-2102)	212.81	บ้าน 2 ชั้น	200-300 ตรม.	180 วัน
The Arbor DC	L (SH-2203)	The Arbor DC: L (SH-2203)	246.00	บ้าน 2 ชั้น	200-300 ตรม.	180 วัน
The Arbor DC	XL (SH-2204)	The Arbor DC: XL (SH-2204)	282.77	บ้าน 2 ชั้น	200-300 ตรม.	180 วัน
The Arbor RW	S (SH-2101)	The Arbor RW: S (SH-2101)	182.11	บ้าน 2 ชั้น	100-200 ตรม.	150 วัน
The Arbor RW	M (SH-2102)	The Arbor RW: M (SH-2102)	204.16	บ้าน 2 ชั้น	200-300 ตรม.	180 วัน
The Arbor RW	L (SH-2203)	The Arbor RW: L (SH-2203)	229.86	บ้าน 2 ชั้น	200-300 ตรม.	180 วัน
The Arbor RW	XL (SH-2204)	The Arbor RW: XL (SH-2204)	269.26	บ้าน 2 ชั้น	200-300 ตรม.	180 วัน
Chann	S (CHN-SH2101)	Chann: S (CHN-SH2101)	274.33	บ้าน 2 ชั้น	200-300 ตรม.	180 วัน
Chann	M (CHN-SH2102)	Chann: M (CHN-SH2102)	330.71	บ้าน 2 ชั้น	300-400 ตรม.	210 วัน
Chann	L (CHN-SH2203)	Chann: L (CHN-SH2203)	360.40	บ้าน 2 ชั้น	300-400 ตรม.	210 วัน
Chann	XL (CHN-SH2204)	Chann: XL (CHN-SH2204)	377.00	บ้าน 2 ชั้น	300-400 ตรม.	210 วัน
Esta BN	บ้านแฝด(DH-2001-A)	Esta BN: บ้านแฝด(DH-2001-A)	126.39	บ้าน 2 ชั้น	100-200 ตรม.	150 วัน
Esta BN	บ้านแฝด(DH-2001-B)	Esta BN: บ้านแฝด(DH-2001-B)	126.39	บ้าน 2 ชั้น	100-200 ตรม.	150 วัน
Esta BN	บ้านแฝด(DH-2001-C)	Esta BN: บ้านแฝด(DH-2001-C)	126.39	บ้าน 2 ชั้น	100-200 ตรม.	150 วัน
Esta BN	บ้านเดี่ยว(SH-2101)	Esta BN: บ้านเดี่ยว(SH-2101)	160.84	บ้าน 2 ชั้น	100-200 ตรม.	150 วัน
Esta Rangsit KL2	บ้านแฝด		ต่ำกว่า 200	บ้าน 2 ชั้น	100-200 ตรม.	150 วัน
	บ้านเดี่ยว		ต่ำกว่า 200	บ้าน 2 ชั้น	100-200 ตรม.	150 วัน

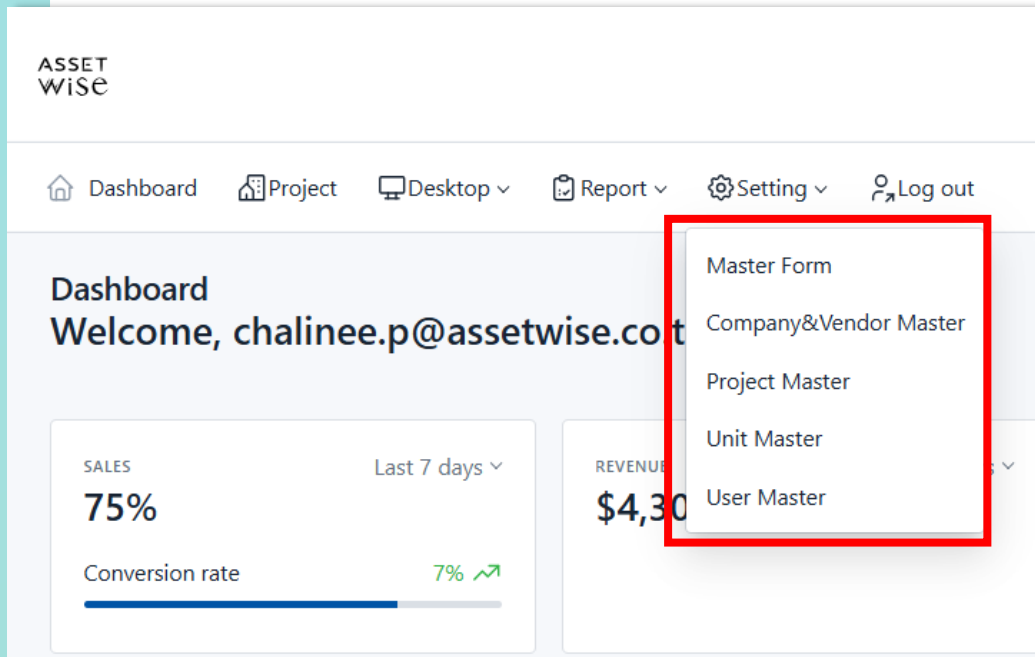

ກນ set master ຕ່າງໆ

1. Form Master : Set form ມາດຮຽນ
2. Company & Vendor Master : ກນ Set ກຣນີມີ Vendor ໃໝ່/ ແກ້ໄຂ Vendor
3. Project Master
4. Unit Master
5. User Master

Set Master Form

จากงานที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

งวดงานก่อสร้างบ้าน/ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ขนาดไม่เกิน 400 m2 (12 งวด)			SDH/DH - 2 ชั้น
			300-400 ตรม.
งวดที่	รายละเอียดงาน	%	210 วัน
1	งาน วางผัง ฐานราก คานคอดินและเสาชั้นล่าง แล้วเสร็จ	10.0%	18
2	งานพื้นสำเร็จชั้นล่าง งานคานชั้น 2 และ เสาชั้นบน จนแล้วเสร็จ	10.0%	18
3	งานพื้นสำเร็จชั้นบน Topping R.C. คานหลังคา (ถ้ามี) โครงหลังคาและติดตั้ง เข็มชาย หลังคา จนแล้วเสร็จ	10.0%	18
4	งานก่ออิฐ งานฝังท่อไฟฟ้าประปาในผนัง ตั้งวงกบแบบเปียก (ถ้ามี) มุงหลังคารอบบน และโครงสร้างบันได(กรณีเป็นบันได คสล.)จนแล้วเสร็จ	10.0%	18
5	งานฉาบปูนภายนอก 100% โครงฝ้าชายคาภายนอกชั้นบน 100%และงานระบบประปาท่อน้ำดี-ท่อน้ำทิ้ง จนแล้วเสร็จ	7.5%	17
6	งานฉาบปูนภายใน 100% และติดตั้งฝ้าชายคาภายนอก ติดตั้งบัวปูนบัน จนแล้วเสร็จ	5.0%	17
7	งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ งานทำกันซึมพื้นห้องน้ำทุกห้อง และระเบียง งานเทพปรับระดับ พื้นชั้นบน ชั้นล่าง และบันได งานตั้งวงกบแบบแห้ง(ถ้ามี) และ งานติดตั้งผนังตกแต่ง ภายนอก(ถ้ามี) จนแล้วเสร็จ	7.5%	20
8	งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย งานติดตั้งฐานบิมน้ำและฐานถังเก็บน้ำ ถังดักไขมัน จนแล้วเสร็จ งานเดินท่อไฟฟ้าชั้น 1,2 แล้วเสร็จ 100%	5.0%	12
9	งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าภายใน งานเดินสายไฟ งานมุงหลังคารอบล่าง (ถ้ามี) งานติดตั้งบาน ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก และ อุปกรณ์ประตูหน้าต่าง งานSkim ทาสีรองพื้น ภายใน-ภายนอก และงานสีจริงภายนอก 100% งานเดินระบบ site drainageและท่อ สุขาภิบาลภายนอก และงานเคลียร์ความสะอาดเพื่อส่งมอบที่ก่อนปฐุสติดทับ	10.0%	18
10	งานติดตั้งฝ้าภายใน-ภายนอก ชั้นบน-ชั้นล่าง 100% งานไม้มอบฝ้า (ถ้ามี) งานปู กระเบื้องพื้นห้องน้ำ 100% กระเบื้องพื้นชั้นบน-ชั้นล่าง และลานจอดรถ งานติดตั้งบานประตู ภายในพร้อมอุปกรณ์ จนแล้วเสร็จ	10.0%	18
11	งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า สุขภัณฑ์ บิมน้ำ ถังน้ำดี งานพื้นผิวบน-ล่าง งานบัวเชิงผนังชั้นบน- ชั้นล่างและบันได งานทาสีจริง 100% ทั้งหลัง ตรวจสอบการใช้งานระบบไฟฟ้า-ประปาและ ทำความสะอาดบ้านภายใน-ภายนอก จนแล้วเสร็จ	10.0%	18
12	เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจคุณภาพงานก่อสร้างและผู้รับจ้างได้เก็บงานตามรายการแล้วเสร็จและ ผ่านคุณภาพงานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดครบถ้วน	5.0%	18

งวดที่ 1	งาน วางผัง ฐานราก คานคอดินและเสาชั้นล่าง แล้วเสร็จ	
รายการตรวจหลัก	รายการตรวจย่อย	
งานฐานราก	ส่วนที่ 1 รายการขออนุมัติการทำงาน	ตัดเสาเข็ม Pile deviate Seismic test คอนกรีตหยาบ หัวเข็ม เหล็กเสริม-ลูกปูน ระยะ-ขนาด-ระดับ
	ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบ	ระดับหลังฐานราก ผิวคอนกรีต ความแข็งแรงคอนกรีต (ตาม strength ผูกแบบ)
งานคานชั้นล่าง	ส่วนที่ 1 รายการขออนุมัติการทำงาน	เหล็กเสริม-ลูกปูน ทูลข้างรับพื้นสำเร็จ (ถ้ามี) ระยะ-ขนาด-ระดับ เหล็กเสริมรัดหัวแผ่นพื้นเรียบร้อย เหล็กบันได+พื้น+ดริบ
	ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบ	ระดับหลัง-แนวข้างคาน ผิวคอนกรีต เหล็กบันได+พื้น+ดริบ ความแข็งแรงคอนกรีต (ตาม strength ผูกแบบ)
งานเสาชั้นล่าง	ส่วนที่ 1 รายการขออนุมัติการทำงาน	เหล็กเสริม-ลูกปูน ขนาด ระดับ ดิ่ง
	ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบ	ดิ่ง-ระดับหัวเสา ผิวคอนกรีต เหล็กบันได+พื้นหลัง ความแข็งแรงคอนกรีต (ตาม strength ผูกแบบ)
งานเดินท่อกำจัดปลวก	ส่วนที่ 1 รายการขออนุมัติการทำงาน	SPEC ท่อ และอุปกรณ์เสริม SPEC น้ำยา และปริมาณ
	ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบ	ตำแหน่ง ระดับ จุดยัด ท่อเติมน้ำยา Spray หัวถึง ไม่อุดตัน น้ำยา ปริมาณน้ำยาที่เติมตามมาตรฐาน

เพิ่มฟอร์มสำหรับใช้ตรวจงวดงาน

ASSET WISE

Chaline Pratyasunti Administrator

Dashboard Project Desktop Report Setting Log out

รายการประเภทฟอร์ม

Search...

+ Create

ประเภทโครงการ	ชื่อประเภทฟอร์ม	รายละเอียด	วันที่อัปเดต	ACTION
แนวราบ (บ้าน)	บ้าน 2 ชั้น ขนาด 200-300 ตรม. (12 งวด-180 วัน)	บ้าน 2 ชั้น ขนาด 200-300 ตรม. (12 งวด-180 วัน)	2024-09-14 14:49	  
แนวราบ (บ้าน)	บ้าน 2 ชั้น ขนาด 100-200 ตรม. (12 งวด-150 วัน)	บ้าน 2 ชั้น ขนาด 100-200 ตรม. (12 งวด-150 วัน)	2024-08-29 16:57	  

Show 10 entries

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous 1 Next

Create Form

ประเภทโครงการ
Select Project Type เลือกประเภทโครงการเป็น "แนวราบ"

ชื่อประเภทฟอร์ม
กรณารอกข้อมูลชื่อประเภทฟอร์ม ใส่ชื่อแบบฟอร์ม ให้เข้าใจง่าย สื่อถึงประเภทบ้าน ขนาด เวลา

รายละเอียด
กรณารอกข้อมูลรายละเอียด ใส่เหมือนชื่อประเภทฟอร์ม

Cancel บันทึก

เช่น "บ้าน 2 ชั้น ขนาด 300-400 ตรม.(15 งวด-210 วัน)"

Create Form

ประเภทโครงการ
แนวราบ (บ้าน)

ชื่อประเภทฟอร์ม
บ้าน 2 ชั้น ขนาด 300-400 ตรม. (12 งวด-210 วัน)

รายละเอียด
บ้าน 2 ชั้น ขนาด 300-400 ตรม. (12 งวด-210 วัน)

Cancel บันทึก

รายการประเภทฟอร์ม

Search...

Q

+ Create

ประเภทโครงการ	ชื่อประเภทฟอร์ม	รายละเอียด	วันที่อัปเดต	ACTION
แนวราบ (บ้าน)	บ้าน 2 ชั้น ขนาด 300-400 ตรม. (12 งวด-210 วัน)	บ้าน 2 ชั้น ขนาด 300-400 ตรม. (12 งวด-210 วัน)	2024-11-25 15:36	✎ ☰ 🗑
แนวราบ (บ้าน)	บ้าน 2 ชั้น ขนาด 200-300 ตรม. (12 งวด-180 วัน)	บ้าน 2 ชั้น ขนาด 200-300 ตรม. (12 งวด-180 วัน)	2024-09-14 14:49	✎ ☰ 🗑
แนวราบ (บ้าน)	บ้าน 2 ชั้น ขนาด 100-200 ตรม. (12 งวด-150 วัน)	บ้าน 2 ชั้น ขนาด 100-200 ตรม. (12 งวด-150 วัน)	2024-08-29 16:57	✎ ☰ 🗑

4

คลิกเพื่อ edit

ฟอร์ม - แสดงแบบฟอร์ม

Lv.1 - Form Lv.1

+ Create

ชื่อ	PROGRESS(%)	ระยะเวลา(วัน)	ACTION
No data available in table			

Showing 0 to 0 of 0 entries

Lv.2 - FormGroup Lv.2

+ Create

Lv.3 - FormPackage Lv.3

+ Create

Lv.4 - FormCheckList Lv.4

+ Create

Lv.1

งานที่ 1	งาน วางผัง ฐานราก คานคอดินและเสาชั้นล่าง แล้วเสร็จ	
รายการตรวจหลัก งานฐานราก Lv.2	ส่วนที่ 1 รายการขออนุมัติการทำงาน ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบ	รายการตรวจย่อย ตัดเสาเข็ม Pile deviate Seismic test คอนกรีตหยาด หัวเข็ม เหล็กเสริม-ลูกปูน ระยะ-ขนาด-ระดับ ระดับหลังฐานราก หัวคอนกรีต ความแข็งแรงคอนกรีต (ตาม strength ผูกออกแบบ) พู่ข้างรับพื้นสำเร็จ (ถ้ามี) ระยะ-ขนาด-ระดับ เหล็กเสริมรัดหัวแผ่นพื้นเรียบร้อย เหล็กบันได+พื้น+คาน ระดับหลัง-แนวข้างคาน หัวคอนกรีต เหล็กบันได+พื้น+คาน ความแข็งแรงคอนกรีต (ตาม strength ผูกออกแบบ) เหล็กเสริม-ลูกปูน
งานคานชั้นล่าง	ส่วนที่ 1 รายการขออนุมัติการทำงาน ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบ	พู่ข้างรับพื้นสำเร็จ (ถ้ามี) ระยะ-ขนาด-ระดับ เหล็กเสริมรัดหัวแผ่นพื้นเรียบร้อย เหล็กบันได+พื้น+คาน ระดับหลัง-แนวข้างคาน หัวคอนกรีต เหล็กบันได+พื้น+คาน ความแข็งแรงคอนกรีต (ตาม strength ผูกออกแบบ) เหล็กเสริม-ลูกปูน
งานเสาชั้นล่าง	ส่วนที่ 1 รายการขออนุมัติการทำงาน ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบ	ขนาด ระดับ ตั้ง ตั้ง-ระดับหัวเสา หัวคอนกรีต เหล็กบันได+พื้นหลัง ความแข็งแรงคอนกรีต (ตาม strength ผูกออกแบบ)
งานเดินท่อกำจัดปลวก	ส่วนที่ 1 รายการขออนุมัติการทำงาน ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบ	SPEC ท่อ และอุปกรณ์เสริม SPEC ป้ายา และปริมาณ ตำแหน่ง ระดับ จุดยึด ท่อเดิมป้ายยา Spray ท่อส่ง ไม่อุดตัน ป้ายา ปริมาณป้ายยาที่เดิมตามมาตรฐาน

11

Lv.1 : ใส่รายละเอียดงวดงาน ,% จ่ายในงวดนั้น , จำนวนวัน , QC

งวดงานก่อสร้างบ้าน/ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ขนาดไม่เกิน 400 ม2 (12 งาน)			SDH/DH - 2 ชั้น	
			300-400 ตรม.	
งวดที่	รายละเอียดงาน	%	210 วัน	QC
1	งาน วางผัง ฐานราก คานคอดินและเสาชั้นล่าง แล้วเสร็จ	10.0%	18	QC 1 : ก่อนปิดแผ่นพื้น
2	งานพื้นสำเร็จชั้นล่าง งานคานชั้น 2 และ เสาชั้นบน จนแล้วเสร็จ	10.0%	18	
3	งานพื้นสำเร็จชั้นบน Topping R.C. คานหลังคา (ถ้ามี) โครงหลังคาและติดตั้ง เชิงชาย หลังคา จนแล้วเสร็จ	10.0%	18	
4	งานก่ออิฐ งานสัฟท้อไฟฟ้าประปาในผนัง ตั้งวงกบแบบเปียก (ถ้ามี) มุงหลังคารอบบน และโครงสร้างบันได(กรณีเป็นบันได คสล.)จนแล้วเสร็จ	10.0%	18	QC 2 : งานหลังคาและมุงกระเบื้อง QC 3 : ก่อนฉาบผนังภายใน
5	งานฉาบปูนภายนอก 100% โครงฝ้าชายคาภายนอกชั้นบน 100%และงานระบบประปาท่อน้ำดี-ท่อน้ำทิ้ง จนแล้วเสร็จ	7.5%	17	
6	งานฉาบปูนภายใน 100% และติดตั้งฝ้าชายคาภายนอก ติดตั้งบัวปูนบัน จนแล้วเสร็จ	5.0%	17	
7	งานปูกระเบื้องผนังห้องนํ้า งานทำกันซึมพื้นห้องนํ้าทุกห้อง และระเบียบ งานเทพริบระดับ พื้นชั้นบน ชั้นล่าง และบันได งานตั้งวงกบแบบแห้ง(ถ้ามี) และ งานติดตั้งผงดกแต่ง ภายนอก(ถ้ามี) จนแล้วเสร็จ	7.5%	20	
8	งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย งานติดตั้งฐานบิ่มนํ้าและฐานถังเก็บนํ้า สังกักไขมัน จนแล้วเสร็จ งานเดินท่อน้ำฟ้าชั้น 1,2 แล้วเสร็จ 100%	5.0%	12	
9	งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าภายใน งานเดินสายไฟ งานมุงหลังคารอบล่าง (ถ้ามี) งานติดตั้งบาน ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก และ อุปกรณ์ประตูหน้าต่าง งานSkim ทาสีรองพื้น ภายใน-ภายนอก และงานสีจริงภายนอก 100% งานเดินระบบ site drainageและท่อ สุขาภิบาลภายนอก และงานเคลียร์ความสะอาดเพื่อส่งมอบที่ก่อนปฐกฐิน	10.0%	18	QC 4 : ก่อนปิดแผ่นฝ้าภายใน ภายนอก
10	งานติดตั้งฝ้าภายใน-ภายนอก ชั้นบน-ชั้นล่าง 100% งานไม้มอบฝ้า (ถ้ามี) งานปู กระเบื้องพื้นห้องนํ้า 100% กระเบื้องพื้นชั้นบน-ชั้นล่าง และลานจอดรถ งานติดตั้งบานประตู ภายในพร้อมอุปกรณ์ จนแล้วเสร็จ	10.0%	18	
11	งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า สุขภัณฑ์ บิ่มนํ้า สังกักนํ้า งานพื้นผิวบน-ล่าง งานบัวเชิงผนังชั้นบน- ชั้นล่างและบันได งานทาสีจริง 100% ทั้งหลัง ตรวจสอบการใช้งานระบบไฟฟ้า-ประปาและ ทดความสะอาดบ้านภายใน-ภายนอก จนแล้วเสร็จ	10.0%	18	
12	เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจคุณภาพงานก่อสร้างและผู้รับจ้างได้เก็บงานตามรายการแล้วเสร็จและ ผ่านคุณภาพงานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดครบถ้วน	5.0%	18	QC 5 : End Product

Go Back

ฟอร์ม - แสดงแบบฟอร์ม

Lv.1 - Form

ชื่อ

Showing 0 to 0 of 0 entries

Lv.2 - FormGroup

Lv.3 - FormPackage

Lv.4 - FormCheckList

Create Master Form

ชื่อฟอร์ม

กรณีนารถกรอกข้อมูลชื่อฟอร์ม

งวดที่ 1

รายละเอียด

คุณนารถกรอกข้อมูลรายละเอียดงาน

งานจ้างจ้าง ช่างรื้อถอนบ้านเลขที่ 123 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Progress

เปอร์เซ็นต์การทำงาน(%)

10%

Duration

ระยะเวลาทำงาน (วัน)

18

ตัวเลือก QC

QC1

ยกเลิก

บันทึก

Lv.2 : ใส่รายการตรวจหลัก ทั้งหมดที่ละรายการ ที่เป็นของงวดงานนั้นๆ

Lv.1 - Form				+Create
ชื่อ	PROGRESS(%)	ระยะเวลา(วัน)	ACTION	
☒ งวดที่ 1	10	18		
Showing 1 to 1 of 1 entries				

Lv.2 - FormGroup : งวดที่ 1		+Create
ชื่อ	ACTION	

Lv.1 - Form

ชื่อ	
☒ งวดที่ 1	
Showing 1 to 1 of 1 entries	

Lv.2 - FormGroup : งวดที่ 1

Create Master Form Group

ชื่อฟอร์ม

งวดที่ 1

ชื่อกลุ่มฟอร์ม

งานฐานราก

ยกเลิก

บันทึก

No data available in table

Showing 0 to 0 of 0 entries

Lv.1	
งวดที่ 1	งาน วางผัง ฐานราก คานคอด
รายการตรวจหลัก	
งานฐานราก	ส่วนที่ 1 รายการขออนุมัติการท
	ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบ
งานคานชั้นล่าง	ส่วนที่ 1 รายการขออนุมัติการท
	ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบ
งานเสาชั้นล่าง	ส่วนที่ 1 รายการขออนุมัติการท
	ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบ
งานเดินท่อฝ้าฉาบฉวย	ส่วนที่ 1 รายการขออนุมัติการท
	ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบ
งวดงาน 2 ชั้นไม่เกิน 4	

Lv.3 : ใส่ package การตรวจ ในแต่ละหมวดให้ครบ ของงานนั้นๆ

Lv.2 - FormGroup : หมวดที่ 1

ชื่อ ACTION

งานฐานราก

Showing 1 to 1 of 1 entries

Lv.3 - FormPackage : งานฐานราก

ชื่อ ACTION

Showing 1 to 1 of 1 entries

Lv.2 - FormGroup : หมวดที่ 1

Showing 1 to 1 of 1 entries

Lv.3 - FormPackage : งานฐานราก

ชื่อยกเลิก

ชื่อ

ACTION

Create Master Form Package

ชื่อกลุ่มฟอร์ม

งานฐานราก

ชื่อแพ็คเกจฟอร์ม

ส่วนที่ 1 รายการขออนุมัติการทำงาน

บันทึก

Lv.1

หมวดที่ 1

งาน วางผัง ฐานราก คานคอดินแล้ว

รายการตรวจหลัก

งานฐานราก

Lv.2

Lv.3

ส่วนที่ 1 รายการขออนุมัติการทำงาน

ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบ

งานคานชั้นล่าง

ส่วนที่ 1 รายการขออนุมัติการทำงาน

ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบ

งานเสาชั้นล่าง

ส่วนที่ 1 รายการขออนุมัติการทำงาน

ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบ

งานเดินท่อน้ำทิ้ง

ส่วนที่ 1 รายการขออนุมัติการทำงาน


ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบ

หมวดงาน 2 ชิ้น ไม่เกิน 400

15

+ Create

ACTION



+ Create

ACTION

Lv.1

งาน วางผัง ฐานราก คานคอดินและเสาชั้นล่าง แล้วเสร็จ

ACTION

รายการตรวจย่อย

Lv.3

Lv.4

ส่วนที่ 1 รายงานขออนุมัติการทำงาน

ตัดเสาเข็ม

บันทึก

หมายเหตุ

- กรณีกำหนด form แล้วใช้งานแล้ว ข้อมูล form นั้นจะ fix ไปด้วย unit นั้นจนจบ ไม่สามารถแก้ไขได้แล้ว
- ถ้ามี Unit ใหม่ สามารถแก้ไข % Progress และ จำนวนวันที่ก่อสร้างได้ (ห้ามแก้ไขเนื้อหาในการตรวจ) ซึ่งจะ effect เฉพาะกับ Unit ที่ใช้งาน form หลังจากนั้น
- ถ้ากรณีแก้ไข นอกเหนือจาก %progress หรือ จำนวนวันที่ก่อสร้าง ต้องสร้างแบบฟอร์มใหม่ (โดยต้องแจ้ง IT เพื่อปรับในระบบให้)

Create Master Form

< Go Back

ฟอร์ม - แสดงแบบฟอร์ม

Lv.1 - Form

ชื่อ

Showing 0 to 0 of 0 entries

Lv.2 - FormGroup

Lv.3 - FormPackage

Lv.4 - FormCheckList

ชื่อฟอร์ม

กรณารอกข้อมูลชื่อฟอร์ม

งวดที่ 1

รายละเอียด

งานวางผัง ฐานราก คานคอดินและเสาชั้นล่าง แล้วเสร็จ

Progress

เปอร์เซ็นต์การทำงาน(%)

10%

Duration

ระยะเวลาทำงาน (วัน)

18

ตัวเลือก QC

QC1

ยกเลิก

บันทึก

Company & Vendor Master

Dashboard

Welcome, chalineep@assetwise.co.th

Master Form

Company&Vendor Master

Project Master

SALES

75%

Conversion rate

Last 7 days

7% 

REVENUE

\$4

รายชื่อบริษัท

Search...

[+ Create](#)

ชื่อบริษัท

วันที่อัปเดต

ACTION

บริษัท วิศว์ จักัด

2024-10-21 17:23



บริษัท พีพีเอส 9 จำกัด

2024-10-21 17:22



บริษัท บ้านธนูสร จำกัด

2024-10-21 17:22



บริษัท โอเนอร์เมท กรุ๊ป จำกัด

2024-10-21 17:22



บริษัท ปิยะสวัสดิ์ จำกัด

2024-09-25 15:36



บริษัท ททรัพย์มณี999 จำกัด

2024-09-25 15:35



กรณีมีผู้รับเหมารายใหม่ ต้องเข้ามา set เพิ่มทุกครั้ง

ASSET WISE

Chaline Pratyasunti Administrator

Dashboard Project Desktop Report Setting Log out

รายชื่อบริษัท

Search...

+ Create

ชื่อบริษัท	วันที่อัปเดต	ACTION
บริษัท วิศว์ จักัด	2024-10-21 17:23	 
บริษัท ทีทีเอส 9 จำกัด	2024-10-21 17:22	 
บริษัท บ้านอยุธยา จำกัด	2024-10-21 17:22	 
บริษัท โอเนอริมา กรุ๊ป จำกัด	2024-10-21 17:22	 
บริษัท ปิยะสวัสดิ์ จำกัด	2024-09-25 15:36	 
บริษัท ทรัพย์นิยม 999 จำกัด	2024-09-25 15:35	 

ใส่ชื่อ บริษัทผู้รับเหมา

Create Company

ชื่อบริษัท

บริษัท อัดโต้ กรุ๊ป

Cancel

บันทึก

รายชื่อบริษัท

Search...

+ Create

ชื่อบริษัท	วันที่อัปเดต	ACTION
บริษัท อัดโต้ กรุ๊ป จำกัด	2024-11-26 15:49	 

สำคัญ !! : กรณีที่ผู้รับเหมามีการเปลี่ยนผู้คุมงาน Admin จะต้องมา update ข้อมูลตรงจุดนี้ด้วย เพราะ ชื่อผู้ควบคุมงานจะใช้แสดงในหน้าตรวจ เพื่อประกอบการเซ็นรับในระบบ กับทาง PE/SE (และแสดงชื่อในเอกสารเบิกงานด้วย)

ข้อมูล Company

ชื่อ

บริษัท อีโต้ กรุ๊ป จำกัด

Mapping โครงการ

5 เลือกชื่อโครงการที่ผู้รับเหมาทำงาน แล้วกด "บันทึก"

บันทึก

ข้อมูล Vendor

6 ใส่ชื่อ-นามสกุล ของผู้ควบคุมงานในสังกัดของผู้รับเหมารายนี้ ที่ดูแลโครงการ พร้อม e-mail

ชื่อผู้ควบคุมงาน

อีเมลล์

เพิ่ม

เสร็จแล้วกดที่ "เพิ่ม"

ชื่อ

อีเมลล์

วันที่อัปเดต

ACTION

No data available in table

Show 10 entries

Showing 0 to 0 of 0 entries

Previous

Next

ชื่อ-นามสกุล ของผู้ควบคุมงานใน
สังกัดของผู้รับเหมา จะแสดงให้เห็นเลือกใน
ระบบเพื่อออกเอกสารตรงจุดนี้

ASSETWISE

เลขที่ใบตรวจ: C400H0076710-001

โครงการ	เลขคำ ซีวีซี นรมราชชนนี	วันที่	2024-10-01 23:42
แปลงที่	AA035	การตรวจ QC	☐ ผ่านการตรวจจาก QC แล้ว
ผู้รับเหมา	บริษัท อีโคโนมิค กรุ๊ป จำกัด		☐ ตรวจไม่มีการตรวจ QC
ผู้ควบคุมงาน	วีระพันธ์ ฉายเนตร		

ครั้งที่ 1

งานวางผัง ฐานราก คานคอลัมน์และเสาชั้นล่าง

รายการตรวจ		ผลการตรวจ			ความเห็น
ฐานราก		ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่มีรายการนี้	
ส่วนที่ 1 รายการขออนุมัติ การทำงาน	ตัดเสาเข็ม	✓			
	Pile deviate	✓			
	Swimio test	✓			
	คอนกรีตหยาบ	✓			
	หัวเข็ม	✓			
	เหล็กเสริม-อุทกปูน	✓			
ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบ	ระดับหลัฐานราก	✓			
	ความแข็งแรงคอนกรีต (ตาม strength ผู้ออกแบบ)	✓			
งานคานชั้นล่าง					
ส่วนที่ 1 รายการขออนุมัติ การทำงาน	เหล็กเสริม-อุทกปูน	✓			
	รูปร่างรับพื้นสำเร็จ (ถ้ามี)	✓			
	ระยะ-ขนาด-ระดับ	✓			
	เหล็กเสริมยึดหัวแม่เหล็ก เรียบร้อย	✓			
	เหล็กบันได+พื้น+เสริม	✓			
ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบ	ระดับหลัง-แนวข้างคาน	✓			
	ผิวคอนกรีต	✓			
	ความแข็งแรงคอนกรีต (ตาม strength ผู้ออกแบบ)	✓			
งานเสาชั้นล่าง					
ส่วนที่ 1 รายการขออนุมัติ การทำงาน	เหล็กเสริม-อุทกปูน	✓			
	ขนาด	✓			
	ระดับ	✓			
	ค้ำ	✓			
ส่วนที่ 2	ค้ำ-ระดับหัวเสา	✓			

รูป. 2ก. 01

ผู้รับเหมา
(คุณ โจชินธุ (KIYAW ZIN OO))

วิศวกรผู้ควบคุมงาน
(วีระพันธ์ ฉายเนตร)

Project Manager
(มานิต อุนางงษ์)

Quality Control (QC)
()

Page 1 of 11

Project Master

Dashboard

Welcome, chalineep@assetwise.co.th

SALES

75%

Conversion rate

Last 7 days

7% 

REVENUE

\$4,30

Master Form

Company&Vendor Master

Project Master

Unit Master

User Master

กรณีมีโครงการใหม่ ที่จะเริ่มใช้งานระบบครั้งแรก

รายการโครงการ

Search...

[+ Create](#)

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	วันที่อัปเดต	ACTION
400H005	ดี อาเบอร์ รามอินทรา-วัชรพล	2024-10-21 17:22	 
400H007	เอสต้า ซีรีนดี้ บรมราชชนนี	2024-09-25 10:48	 

Show entries

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous 1 Next

รายการโครงการ

Search...

+ Create

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	วันที่อัปเดต	ACTION
400H005	ดี อเบอร์ รัมอินทรา-วิชรพล	2024-10-21 17:22	
400H007	เอสต้า ซีรีนดี้ บรมราชชนนี	2024-09-25 10:48	

Show

10

entries

Showing 1 to 2 of 2 entries

1

ใส่ข้อมูลในช่องว่างให้ครบ
โดยให้แจ้งทาง IT ก่อนที่จะเพิ่ม
โครงการใด เพื่อให้ IT ตั้งข้อมูลสำหรับ
Model Mapping ไว้ให้ก่อน

2

Create Project

BU

SE

ประเภทโครงการ

แนวราบ (บ้าน)

รหัสโครงการ

401H001

ชื่อโครงการ

ดี อเบอร์ โยธินพัฒนา

Model Mapping

รหัสโมเดล	ชื่อโมเดล	รหัสประเภทโมเดล	ชื่อประเภทโมเดล	ประเภทฟอร์ม

Cancel

บันทึก

ตัวอย่าง Model Mapping

Edit Project

BU

SE

ประเภทโครงการ

แนวราบ (บ้าน)

รหัสโครงการ

400H005

ชื่อโครงการ

ดี อาเบอร์ รามอินทรา-วิรัชพล

Model Mapping

รหัสโมเดล	ชื่อโมเดล	รหัสประเภทโมเดล	ชื่อประเภทโมเดล	ประเภทฟอร์ม
TAB-SH2101MD(A)	แอช	SDH2	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	บ้าน 2 ชั้น ขนาด 100-200 ตรม. (12
TAB-SH2102MD(A)	เอเธอร์	SDH2	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	กรุณาเลือกประเภทฟอร์ม บ้าน 2 ชั้น ขนาด 100-200 ตรม. (12 งวด-150 วัน) บ้าน 2 ชั้น ขนาด 200-300 ตรม. (12 งวด-180 วัน) บ้าน 2 ชั้น ขนาด 300-400 ตรม. (12 งวด-210 วัน)
TAB-SH2103MD(A)	เบอร์ช	SDH2	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	
TAB-SH2104MD(A)	บีชี	SDH2	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	บ้าน 2 ชั้น ขนาด 200-300 ตรม. (12

Model Mapping คือ การเลือกแบบฟอร์มของบ้าน (จากที่สร้างในหน้า Master form) ให้ตรงกับประเภทบ้านในโครงการ

หมายเหตุ :

ต้องตรวจสอบ Model บ้าน ว่าเป็นบ้านชนิดไหน ที่ชั้น ขนาดเท่าไร เพื่อให้สามารถเลือกได้ถูกต้อง

Type บ้านและแบบฟอร์ม

โครงการ	แบบบ้าน	โครงการและแบบบ้าน	พื้นที่ก่อสร้าง	ประเภทมาตรฐาน	พื้นที่ก่อสร้าง	ระยะเวลาก่อสร้าง
The Honor	Type S	The Honor Type S	354.69	บ้าน 3 ชั้น	300-400 ตรม.	240 วัน
The Honor	Type M	The Honor Type M	462.03	บ้าน 3 ชั้น	400-600 ตรม.	270 วัน
The Honor	Type L	The Honor Type L	591.91	บ้าน 3 ชั้น	400-600 ตรม.	270 วัน
The Arbor DC	S (SH-2101)	The Arbor DC: S (SH-2101)	184.66	บ้าน 2 ชั้น	100-200 ตรม.	150 วัน
The Arbor DC	M (SH-2102)	The Arbor DC: M (SH-2102)	212.81	บ้าน 2 ชั้น	200-300 ตรม.	180 วัน
The Arbor DC	L (SH-2203)	The Arbor DC: L (SH-2203)	246.00	บ้าน 2 ชั้น	200-300 ตรม.	180 วัน
The Arbor DC	XL (SH-2204)	The Arbor DC: XL (SH-2204)	282.77	บ้าน 2 ชั้น	200-300 ตรม.	180 วัน
The Arbor RW	S (SH-2101)	The Arbor RW: S (SH-2101)	182.11	บ้าน 2 ชั้น	100-200 ตรม.	150 วัน
The Arbor RW	M (SH-2102)	The Arbor RW: M (SH-2102)	204.16	บ้าน 2 ชั้น	200-300 ตรม.	180 วัน
The Arbor RW	L (SH-2203)	The Arbor RW: L (SH-2203)	229.86	บ้าน 2 ชั้น	200-300 ตรม.	180 วัน
The Arbor RW	XL (SH-2204)	The Arbor RW: XL (SH-2204)	269.26	บ้าน 2 ชั้น	200-300 ตรม.	180 วัน
Chann	S (CHN-SH2101)	Chann: S (CHN-SH2101)	274.33	บ้าน 2 ชั้น	200-300 ตรม.	180 วัน
Chann	M (CHN-SH2102)	Chann: M (CHN-SH2102)	330.71	บ้าน 2 ชั้น	300-400 ตรม.	210 วัน
Chann	L (CHN-SH2203)	Chann: L (CHN-SH2203)	360.40	บ้าน 2 ชั้น	300-400 ตรม.	210 วัน
Chann	XL (CHN-SH2204)	Chann: XL (CHN-SH2204)	377.00	บ้าน 2 ชั้น	300-400 ตรม.	210 วัน
Esta BN	บ้านแฝด(DH-2001-A)	Esta BN: บ้านแฝด(DH-2001-A)	126.39	บ้าน 2 ชั้น	100-200 ตรม.	150 วัน
Esta BN	บ้านแฝด(DH-2001-B)	Esta BN: บ้านแฝด(DH-2001-B)	126.39	บ้าน 2 ชั้น	100-200 ตรม.	150 วัน
Esta BN	บ้านแฝด(DH-2001-C)	Esta BN: บ้านแฝด(DH-2001-C)	126.39	บ้าน 2 ชั้น	100-200 ตรม.	150 วัน
Esta BN	บ้านเดี่ยว(SH-2101)	Esta BN: บ้านเดี่ยว(SH-2101)	160.84	บ้าน 2 ชั้น	100-200 ตรม.	150 วัน
Esta Rangsit KL2	บ้านแฝด		ต่ำกว่า 200	บ้าน 2 ชั้น	100-200 ตรม.	150 วัน
	บ้านเดี่ยว		ต่ำกว่า 200	บ้าน 2 ชั้น	100-200 ตรม.	150 วัน

Unit Master

Dashboard

Welcome, chalineep@assetwise.co.th

SALES

75%

Conversion rate

Last 7 days ▾

7% ↗

REVENUE

\$4,300

Master Form

Company&Vendor Master

Project Master

Unit Master

User Master

ผูก Unit กับผู้รับเหมา /เลข PO/ PE หรือ SE ผู้รับผิดชอบ

รายการยูนิต

ดี อาเบอ์ รัมอินทรา-วัชรพล

Search...



Mapping PE

+ Create

☐	ผู้รับผิดชอบ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	รหัสยูนิต	ประเภทยูนิต	เลขที่อยู่	เนื้อที่	สถานะยูนิต	VENDOR	PO	วันที่เริ่มงาน	วันที่สิ้นสุด	
☐	จำรัช รุ่งเรือง	400H005	ดี อาเบอ์ รัมอินทรา-วัชรพล	AA001		NULL	212.5	ว่าง		P0000001	2024-11-17	2025-05-16	20
☐	อุษณีย์ พรหมอ่อน	400H005	ดี อาเบอ์ รัมอินทรา-วัชรพล	AA002		NULL	50.3	ว่าง		P0000001	2024-11-17	2025-04-16	20
☐		400H005											
☐		400H005											
☐		400H005											
☐		400H005	ดี อาเบอ์ รัมอินทรา-วัชรพล	AA006		NULL	54.9	จอง					

ใน Unit Master ฝ่าย IT จะดึงข้อมูลทุกแปลงในโครงการมาให้แล้ว โดย Admin จะต้องมีส่วนที่ผูกข้อมูลกับ **ผู้รับเหมา / เลข PO / วันที่เริ่มงาน**

วิธีผูกข้อมูล ผู้รับเหมา กับ Unit

ดี อาเบอร์ รามอินทรา-วัชรพล

Search...



Mapping PE

+ Create

รายการ	ชื่อโครงการ	รหัสยูนิต	ประเภทยูนิต	เลขที่อยู่	เนื้อที่	สถานะยูนิต	VENDOR	PO	วันที่เริ่มทำงาน	วันที่สิ้นสุด	วันที่อัปเดต	ACTION
H005	ดี อาเบอร์ รามอินทรา-วัชรพล	AA001		NULL	212.5	ว่าง		P0000001	2024-11-17	2025-05-16	2024-11-17 11:56	
H005	ดี อาเบอร์ รามอินทรา-วัชรพล	AA002		NULL	50.3	ว่าง		P0000001	2024-11-17	2025-04-16	2024-11-17 20:00	
H005	ดี อาเบอร์ รามอินทรา-วัชรพล	AA003		NULL	54.9	ว่าง					2024-10-21 15:59	
H005	ดี อาเบอร์ รามอินทรา-วัชรพล	AA004		NULL	54.9	ว่าง					2024-10-21 15:59	
H005	ดี อาเบอร์ รามอินทรา-วัชรพล	AA005		NULL	54.9	จอง					2024-10-21 15:59	

1

เลื่อนหน้าจอมา
ด้านขวาสุด จะพบ
สัญลักษณ์รูปดินสอ

Edit Unit

2

เลือกบริษัทผู้รับเหมา (ต้องสร้างผู้รับเหมาใน Vendor master ก่อน)

บริษัทผู้รับเหมา

กรุณาเลือกผู้ควบคุมงาน

PO

วันที่เริ่มทำงาน

dd-----yyyy

Cancel

บันทึก

3

ใส่เลขที่ PO ที่สั่งจ้างผู้รับเหมา ของแปลงนี้

4

ใส่วันที่เริ่มงานตามสัญญา

สำคัญ :

กรณีเปลี่ยนผู้รับเหมาระหว่างทาง
(พรม.รายเดิมทิ้งงาน) ให้มาแก้ไข
ข้อมูลผู้รับเหมา โดยใส่บริษัทใหม่ และ
เลข PO ใหม่ด้วย
ถ้าไม่แก้ไข พรม.รายใหม่จะเบิก
เงินงวดงานไม่ได้ เพราะเอกสารเบิก
และเลข PO จะไม่ตรงกับปัจจุบัน

* ไม่ต้องเปลี่ยนวันที่เริ่มงาน

วิธีผูกชื่อ PE หรือ SE ที่ดูแล unit นั้นๆ

ASSET
WiSE

[Dashboard](#) [Project](#) [Desktop](#) [Report](#) [Setting](#) [Log out](#)

รายการยูนิต

ดี อาเบอร์ รามอินทรา-วัชรพล

Search...



Mapping PE

2

click ที่ปุ่ม Mapping PE

☐	ผู้รับผิดชอบ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	รหัสยูนิต
☐	จำรัส รุ่งเรือง	400H005	ดี อาเบอร์ รามอินทรา-วัชรพล	AA001
☐	อุษณีย์ พรหมอ่อน	400H005	ดี อาเบอร์ รามอินทรา-วัชรพล	AA002
☒		400H005	ดี อาเบอร์ รามอินทรา-วัชรพล	AA003

1

เลือกแปลง

Mapping PE/SE Unit

รายชื่อ PE/SE

กรุณาเลือก PE/ SE


Cancel

บันทึก

3

เลือกชื่อ PE/SE
(จะต้องผูกชื่อ PE/SE กับ
โครงการก่อนใน Unit Master)

User Master

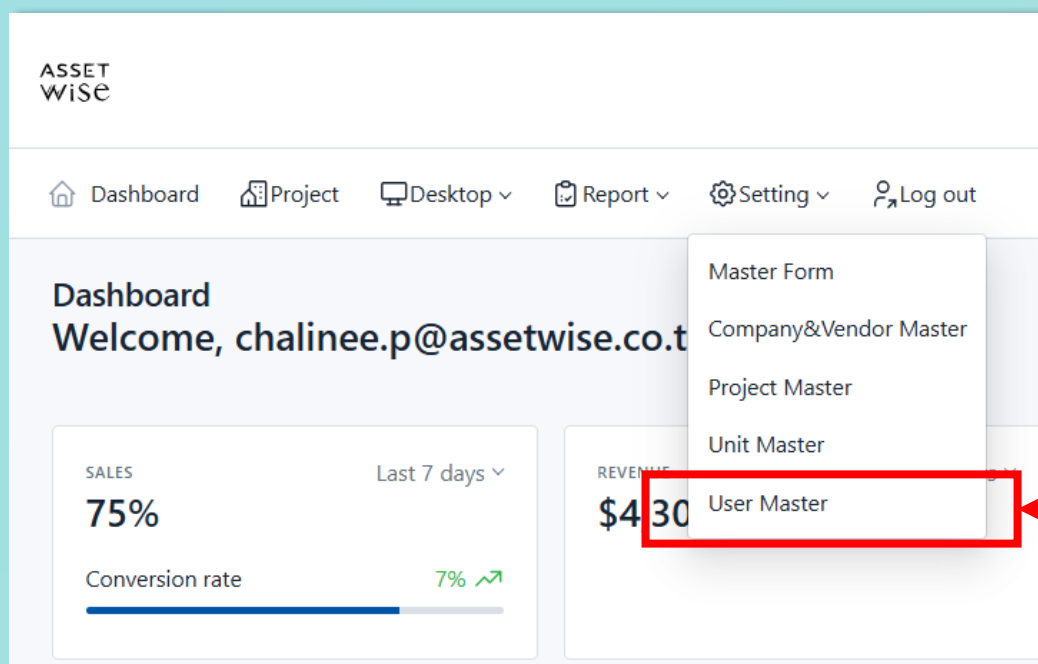

สร้าง User ในโครงการ และผูกกับบทบาท

ASSET WISE Chaline Pratyasunti Administrator

Dashboard Project Desktop Report Setting Log out

รายการผู้ใช้งาน

Search... + Create

ชื่อ	นามสกุล	อีเมล	เบอร์โทรศัพท์	ตำแหน่ง	ROLE	ACTION
อุษณีย์	พรมอ่อน	Usanee.p@assetwise.co.th	0935757270	Position 1	PE/SE	 
อาสา	ศรีโนนยางค์	arsa.s@assetwise.co.th	0611479108	Position 1	PE/SE	 
สิทธกร	โพธิ์	Sittikron@mail.com	085-188-1582	Position 1	PE/SE	 
ศิริพนธ์	เสริมเกียรติสกุล	siripoj@assetwise.co.th	0876724100	Position 1	Admin	 

Create User

ใช้ email เป็น
Username

ชื่อ

นามสกุล

อีเมลล์

หมายเลขโทรศัพท์

BU

ตำแหน่ง

Role

เลือก Role

กรุณาเลือก Role

PE/SE

PM

PJM

QC

Admin

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

เลือกสิทธิ์โครงการ

- ☐ ดิ อาเนอร์ รมอินทรา-วัชรพล
- ☐ ดิ อเนอร์ โยธินพัฒนา
- ☐ เอสต้า ซีรีนิตี้ บรมราชชนนี

เลือก โครงการที่รับผิดชอบ

บันทึก

PE/SE : ผู้ทำรายการตรวจงวด

PM : ผู้อนุมัติรายการตรวจ

PJM : ผู้บริหารระดับสูงกว่า PM
(เพื่ออนุมัติกรณีผ่านแบบมีเงื่อนไข)


QC : ผู้ตรวจสอบคุณภาพ

Admin : ผู้ set ข้อมูลในระบบ และ
เป็นผู้ทำรายการบันทึกเลข GR ใน
หน้าเบิกงวดงาน

สำหรับ Role PE/SE, PM, PJM, QC

หลังจากสร้าง User ให้พนักงานใน role เหล่านี้เสร็จแล้ว จะต้องให้ User บันทึกลายเซ็นลงในระบบ เพื่อให้สามารถออกเอกสารตรวจได้ (เนื่องจากเอกสารตรวจทั้งส่วนของก่อสร้าง และ QC จำเป็นต้องมีลายเซ็นในเอกสาร)

ให้ User คลิกที่มุมบนขวา และเลือก "Profile"

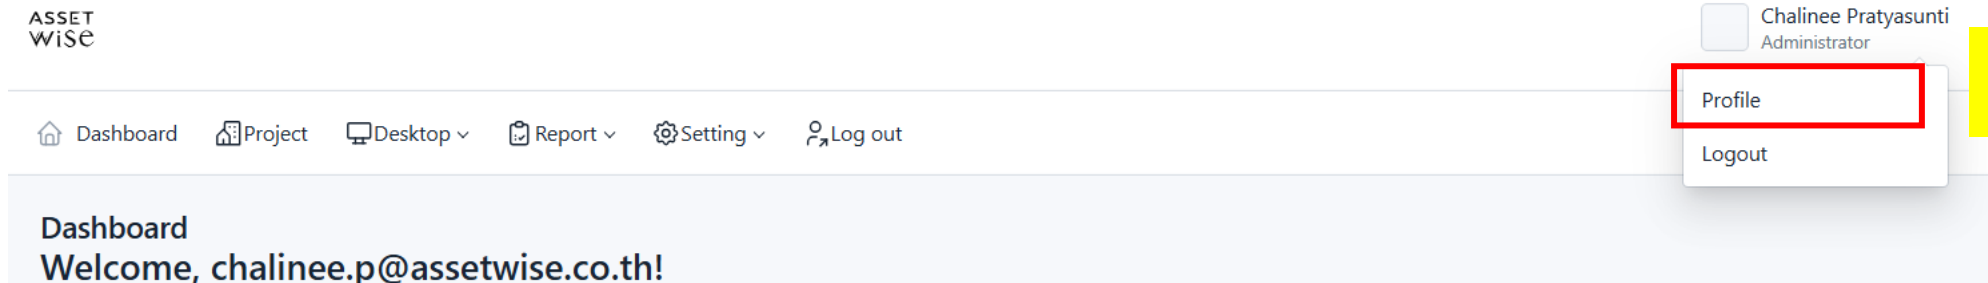

Edit User

ชื่อ

Chalinee

นามสกุล

Pratyasunti

อีเมลล์

chalinee.p@assetwise.co.th

หมายเลขโทรศัพท์

11111111

BU

SE

ตำแหน่ง

Position 1

Role

Admin

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มลายเซ็น”

2

เพิ่มลายเซ็น

แสดงรูปภาพลายเซ็น

ลายเซ็นผู้รับมอบ

3

เซ็นในช่องว่าง
จากนั้นกด “บันทึก”



4

← เคลียร์

✓ บันทึก

5

กด “บันทึก”
ในหน้าหลักอีกครั้ง

บันทึก

การถอดเบิกงวดงาน

Step 1

Admin
บันทึก GR
ใน SAP

PM กดอนุมัติ
ใน SAP

ระบบ SAP ส่งข้อมูลไปที่ Online billing
3 รอบ กด 7.00 โมง ข้อมูลวิ่งไป 9.00
กด 12.00 ข้อมูลวิ่งไป 14.00
กด 17.00 ข้อมูลวิ่งไป 19.00
กดหลัง 17.00 ข้อมูลวิ่งไปวันรุ่งขึ้น

ถ้าให้สื่อสารง่ายคือ อนุมัติใน SAP วันนี้ ข้อมูล
ทั้งหมดเข้าระบบ Online billing ในวันรุ่งขึ้น
(ให้ Admin กรอก GR ใน CQT วันรุ่งขึ้น)

มี email แจ้งจาก SAP ไปให้ผู้รับเหมา

Step 3


ผู้รับเหมา upload ข้อมูล
ในระบบ Online billing
(1 วันหลังจากได้รับ email
การอนุมัติ GR จาก SAP)

ข้อมูล GR ใน
Online Billing



ระบบ CQT ตรวจสอบ
ข้อมูล GR กับระบบ
Online Billing

ถ้า "ผ่าน" CQT จะส่ง pdf
ของใบตรวจงวดงานไปที่
Online billing



Step 2

Admin กรอกเลข GR ในระบบ CQT
และ เช็คนเลข PO ว่าถูกต้องหรือไม่ (ถ้า
ไม่ถูกต้องก็แก้ไขได้)
(ให้ sure คือวันรุ่งขึ้นหลังจาก PM กด
อนุมัติใน SAP)

เมื่อจบงานได้รับการอนุมัติ พร้อมเบิกจ่าย รายการจะขึ้นแสดงในหน้า Unit payment

[Dashboard](#) [Project](#) [Desktop](#) [รายงาน](#) [Setting](#) [Log out](#)

Unit Payment

Unit Status By Project

Unit Payment

กรุณาเลือกโครงการ

ค้นหา Unit...

ค้นหา

จำนวนรายการทั้งหมด: 9

No.	โครงการ	Unit	งวดที่	ผู้รับเหมา	เลขที่ PO	วันที่อนุมัติ	ใบตรวจงวดงาน	ใบตรวจ QC	เลข GR	วันที่บันทึก GR	สถานะบัญชี
1	เอสต้า ซีรีนิตี้ บรมราชชนนี	AA001	งวดที่ 1	บริษัท ปิยะสวัสดิ์ จำกัด	- PO000001 - PO000001 - PO000001	14-Nov-2024		 	- GR-00003 - GR-00003 - GR-00003 ใส่เลข GR	28-Nov-2024	รออัปเดต
2	เอสต้า ซีรีนิตี้ บรมราชชนนี	AA001	งวดที่ 2	บริษัท ปิยะสวัสดิ์ จำกัด		14-Nov-2024			ใส่เลข GR		รออัปเดต
3	เอสต้า ซีรีนิตี้ บรมราชชนนี	AA001	งวดที่ 5	บริษัท ปิยะสวัสดิ์ จำกัด		27-Nov-2024			ใส่เลข GR		รออัปเดต
4	เอสต้า ซีรีนิตี้ บรมราชชนนี	AA002	งวดที่ 2	บริษัท ปิยะสวัสดิ์ จำกัด		27-Nov-2024			ใส่เลข GR		รออัปเดต

เข้าไปกรอกเลข GR ในงวดงาน และ unit ที่ต้องการเบิกงวดงาน

กรุณาเลือกโครงการ

ค้นหา Unit...

ค้นหา

จำนวนรายการทั้งหมด: 9

No.	โครงการ	Unit	งวดที่	ผู้รับเหมา	เลขที่ PO	วันที่อนุมัติ	ใบตรวจงวดงาน	ใบตรวจ QC	เลข GR	วันที่บันทึก GR	สถานะบัญชี
1	เอสต้า ซีรีนิตี้ บรมราชชนนี	AA001	งวดที่ 1	บริษัท ปิยะสวัสดิ์ จำกัด	- PO000001 - PO000001 - PO000001	14-Nov-2024		 	- GR-00003 - GR-00003 - GR-00003 ใส่เลข GR	28-Nov-2024	● รออัปเดต
2	เอสต้า ซีรีนิตี้ บรมราชชนนี	AA001	งวดที่ 2	บริษัท ปิยะสวัสดิ์ จำกัด		14-Nov-2024			ใส่เลข GR		● รออัปเดต
3	เอสต้า ซีรีนิตี้ บรมราชชนนี	AA001	งวดที่ 5	บริษัท ปิยะสวัสดิ์ จำกัด		27-Nov-2024			ใส่เลข GR		● รออัปเดต
4	เอสต้า ซีรีนิตี้ บรมราชชนนี	AA002	งวดที่ 2	บริษัท ปิยะสวัสดิ์ จำกัด		27-Nov-2024			ใส่เลข GR		● รออัปเดต

วิธีการกรอกข้อมูล

บันทึกเลข GR

โครงการ

เอสต้า ซีรีนิตี้ บรมราชชนนี

แปลง

AA001

งวด

งวดที่ 2

บริษัท

บริษัท ปิยะสวัสดิ์ จำกัด

ผู้รับเหมา

คุณเวรเดช หริ่มรุ่งเรือง

PO Input *

PO000001

1

GR Input *

กรณารชณ GR

2

Percent *

กรณารเลือก

3

เพิ่ม remark เพื่อระบุให้กับทาง vendor portal ทราบ

กรณีเป็นการจ่ายงวด BOQ80 ให้ใส่
remark เพื่อแจ้งฝ่ายบัญชีไว้ด้วย

ล้าง

บันทึก

ลำดับ	PO	GR	PERCENT	หมายเหตุ	สถานะ	วันที่บันทึก GR ล่าสุด	ACTIONS
-------	----	----	---------	----------	-------	------------------------	---------

1. ตรวจสอบเลข PO ว่าถูกต้องหรือไม่ (เลข PO จะดึงมาจากหน้า Unit master ที่เคยใส่ข้อมูล PO และ ผู้รับเหมาไว้) ถ้าไม่ถูกต้อง แก้ไขได้ในหน้านี้ (หรือแก้ไขที่ต้นทางใน Unit master ก็ได้)
2. กรอกเลข GR (1 วันหลังจากที่ PM อนุมัติ GR ใน SAP)
3. ใส่ % → กรณีงวดงานของ BOQ 100 ให้เลือก 100
→ กรณีงวดงานของ BOQ 80 (จ่ายรอบแรก) ให้เลือก 80
→ กรณีเป็นงวดงาน BOQ 80 รอบที่ทำสัญญาเพิ่ม เพื่อจ่ายส่วนต่าง ให้เลือก 20

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

บันทึกเลข GR

โครงการ
เอสต้า ซีรีนิตี้ บรมราชชนนี

แปลง
AA001

งวด
งวดที่ 2

บริษัท
บริษัท ปิยะสวัสดิ์ จำกัด

ผู้รับเหมา
คุณเวอร์เดซ หริ่มรุ่งเรือง

PO Input *
PO000001

GR Input *
กรณารชน GR

Percent *
กรณารเลือก

กรณารเลือก

กรณารเลือก

100

80

20

เพิ่ม remark เพื่อระบุให้กับทาง vendor portal ทราบ

ล้าง

บันทึก

บันทึกเลข GR

โครงการ
เอสต้า ซีรีนิตี้ บรมราชชนนี

แปลง
AA001

งวด
งวดที่ 2

บริษัท
บริษัท ปิยะสวัสดิ์ จำกัด

ผู้รับเหมา
คุณเวอร์เดซ หริ่มรุ่งเรือง

PO Input *
PO000001

GR Input *
GR7890000

Percent *
80

เพิ่ม remark เพื่อระบุให้กับทาง vendor portal ทราบ

เป็นงวดงานจาก BOQ 80

ล้าง

บันทึก



ยืนยันการบันทึกเลข GR Payment

คุณต้องการบันทึกเลข GR Payment นี้ใช่หรือไม่?

ใช่

ยกเลิก

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

บันทึกเลข GR

โครงการ

เอสต้า ซีรีนิตี้ บรมราชชนนี

แปลง

AA001

งวด

งวดที่ 2

บริษัท

บริษัท ปิยะสวัสดิ์ จำกัด

ผู้รับเหมา

คุณเวรเดช หริมรุ่งเรือง

PO Input *

กรณารับ PO

GR Input *

กรณารับ GR

Percent *

กรณารับเลือก

เพิ่ม remark เพื่อระบุให้กับทาง vendor portal ทราบ

ล้าง


บันทึก

ลำดับ	PO	GR	PERCENT	หมายเหตุ	สถานะ	วันที่บันทึก GR ล่าสุด	ACTIONS
1	PO000001	GR7890000	80.00 %	เป็นงวดงานจาก BOQ 80	Success	📅 28-Nov-2024 17:48 👤 Chalinee Pratyasunti	

เมื่อบันทึกเสร็จ จะแสดงเลข GR ในรายการ
งวดงาน (กรณีรวม % ครบ 100 แล้วปุ่มใส่
เลข GR จะไม่สามารถกรอกเลขเพิ่มได้อีก)

จำนวนรายการทั้งหมด: 9

No.	โครงการ	Unit	งวดที่	ผู้รับเหมา	เลขที่ PO	วันที่อนุมัติ	ใบตรวจงวดงาน	ใบตรวจ QC	เลข GR	วันที่บันทึก GR	สถานะบัญชี
1	เอสต้า ซีรีนิตี้ บรมราชชนนี	AA001	งวดที่ 1	บริษัท ปิยะสวัสดิ์ จำกัด	PO000001 PO000001 PO000001	14-Nov-2024	PDF	PDF PDF	GR-00003 GR-00003 GR-00003 ใส่เลข GR	28-Nov-2024	รออัปเดต
2	เอสต้า ซีรีนิตี้ บรมราชชนนี	AA001	งวดที่ 2	บริษัท ปิยะสวัสดิ์ จำกัด	PO000001	14-Nov-2024	PDF		GR7890000 ใส่เลข GR	28-Nov-2024	รออัปเดต
3	เอสต้า ซีรีนิตี้ บรมราชชนนี	AA001	งวดที่ 5	บริษัท ปิยะสวัสดิ์ จำกัด		27-Nov-2024	PDF		ใส่เลข GR		รออัปเดต

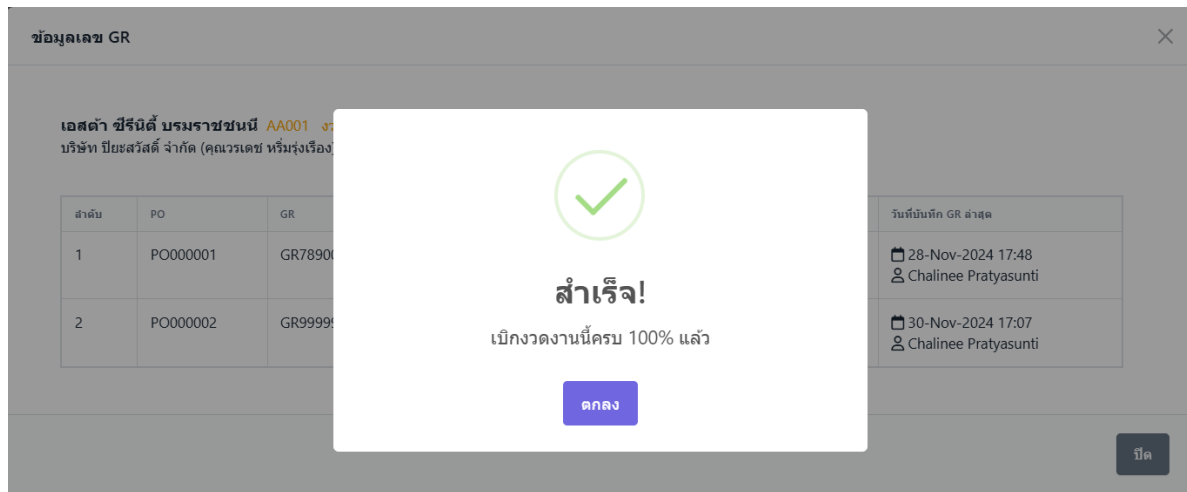

กรณีกรอกครบ 100% แล้ว
ระบบจะแสดงผลว่าครบแล้ว
และจะเพิ่ม GR ไม่ได้อีกในงวด
งานของ unit นั้นๆ

ข้อมูลเลข GR						
เอสต้า ซีรินด์ บรมราชชนนี AA001 งวดที่ 2 บริษัท ปิยะสวัสดิ์ จำกัด (คุณเวรเดช หริ่มรุ่งเรือง)						
ลำดับ	PO	GR	PERCENT	หมายเหตุ	สถานะ	วันที่บันทึก GR ล่าสุด
1	PO000001	GR7890000	80 %	เป็นงวดงานจาก BOQ 80	Success	28-Nov-2024 17:48 Chaline Pratyasunti
2	PO000002	GR9999999	20 %	จ่าย BOQ 80 ส่วนที่เหลือ	Success	30-Nov-2024 17:07 Chaline Pratyasunti

<https://aswinno.assetwise.co.th/cstuat/>

User : admin1 ,admin2, admin3, admin4, admin5

Password : 1234
